




امارات اسلامی افغانستان
هینت رهبری شرکت های امارتی



Islamic Emirate of Afghanistan
Afghan Telecom Corporation



د افغانستان اسلامي امارت
د امارتي شرکتونو رهبري پلاوی

د افغان تېلي کام مخابراتي شرکت لوی ریاست
مالي او اداري معاونیت
تدارکاتو ریاست
تړونونو او امریت
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درجه اهمیت

- ☐ محرم:
- ☐ عاجل:
- ☐ عادی:

شمېره: 552/448

نېټه: ۱۴۴۵/۱۱/۱۲

موضوع: د (MCIT-AFTEL/1402/W-017/NCB) (MCIT-AFTEL/1402/W-018/NCB) پروژو لاسلیک شوي تړونونو د استولو

مزي لرونکي محترم عملياتي معاونیت!

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

د نېکو هیلو په وړاندې کولو سره

لکه څرنګه چې تاسو ته بهرته معلومه ده تاسو نیازمندي پر بنسټ د امارتي شرکتونو رهبري پلاوی سره د هرات، بادغیس ولایت نه تر فاریاب پوري کنډنکاري او پایپ غځوني دریم، پنځم او نیمروز ولایت نه تر دلارام ولسوالي پوري کنډنکاري او پایپ غځوني اول، دوهم او دریم لایونو تړونونه لاسلیک شوي، چې د همدې مکتوب سره مل د پروژو اړوند ذکر شوي یو نقل اصل لاسلیک شوي تړونونه د کار د پیل او تطبیق پر موخه در و استول شول، نو ستاسو محترم معاونیت څخه په خورا درنښت هیله کيږي ترڅو چې په خپل سهم کې لازم اجرات ترسره کړي.

والسلام

مولوي محمد رحيم ندیم
افغان تېلي کام مخابراتي شرکت مالي او اداري معاون

ایم. آر. سرپرست مالی سیکرټری
د امارت شرکتونو د مالی سیکرټری
د امارت شرکتونو د مالی سیکرټری

امریټ OFC
د رابطې طبقې سرپرست د قرارداد اړوند
د امارت اصول و ترمیم غځول
د امارت اصول و ترمیم غځول

د امارت شرکتونو د مالی سیکرټری
د امارت شرکتونو د مالی سیکرټری
د امارت شرکتونو د مالی سیکرټری

2475
1445-11-12



امارت اسلامي افغانستان
هيئت رهبري شرکت های امارتي
شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

قرارداد بالمقطع

برای

پروژه کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی مسیر ولایت نیمروز الی ولسوالي دلارام برای لات سوم



آدرس اداره: محمد جان خان وات تعمیر پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
شماره داوطلبی: MCIT-AFTEL/1402/W-018NCB
لات: سوم

موافقتنامه قرارداد

قرارداد کنندکاری، پایپ و کیبل اندازی مسیر ولایت نیمروز، الی ولسوالی دلارام برای لاپت سوم این موافقتنامه به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ هـ.ش که برابر است به ۱۴۴۵/۱۰/۲۰ هـ.ق. میان شرکت مخابراتی افغان تیلی کام و شرکت ساختمانی سرکسازي و تولید مواد ساختمانی عزیزی گلوبل ثبت شده، تحت قوانین ۱.۱.۱ تحت جواز شماره D-29432 صادره ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری، وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان بوده و آدرس سرک اول کارته پروان کابل - افغانستان می باشد عقد گردیده است. این قرارداد به مدت (۷) هفت ماه مدار اعتبار می باشد.

طوریکه اداره مطابق اعلان تدارکات کنندکاری، پایپ و کیبل اندازی مسیر، بادغس الی فاریاب تحت پنج لاپت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام تحت شماره داوطلبی MCIT-AFTEL/1402/W-018/NCB آفر داوطلب برنده (شرکت ساختمانی سرکسازي و تولید مواد ساختمانی عزیزی گلوبل) را برای کنندکاری، پایپ و کیبل اندازی مسیر ولایت نیمروز الی ولسوالی دلارام برای سوم به قیمت مجموعی (36,361,250) سی و شش میلیون و سه صد و شصت یک هزار و دو صد و پنجاه افغانی می باشد که منبعه بنام «قیمت قرارداد» یاد می شود، قبول نموده است. این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق می نماید:

1. در این موافقتنامه، کلمات و اصطلاحات همان معنی را افاده می نمایند که در شرایط قرارداد برای آنها در نظر گرفته شده است.
2. اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر کی از آنها منحصی بخشی از قرارداد استنباط میگردد:
 - 1.2. موافقتنامه
 - 2.2. شرایط عمومی قرارداد
 - 3.2. شرایط خاص قرارداد
 - 4.2. نیازمندیهای تخنیکي (به شمول جدول نیازمندی ها و مشخصات تخنیکي)
 - 5.2. آفر اکمال کننده و جدول قیمت
3. این قرارداد بالای سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقص یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.
4. در مقابل پرداخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را تهیه و هر نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصلاح نماید.
5. اداره تعهد می نماید که قیمت قرارداد و یا سایر مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد.



بدینوسیله جانبین تصدیق مینماید که این موافقتنامه در مطابقت با قوانین امارت اسلامی افغانستان بوده و سر از تاریخ فوق الی تاریخ / / ۱۴۴۵ قابل اعتبار می باشد.


از طرف و به نمایندگی از اكمال كنده:

زمری

رئیس ساختمانی سرکسازي و تولید مواد ساختمانی

عزیزی گلوبل

امضاء



سرک اول کارته پروان کابل - افغانستان

شماره تماس: ۰۷۷۷۴۰۴۴۷۹



به نمایندگی اداره:


مولوي احمد جان بلال

رئیس هیئت رهنمای شرکت های امارتی

امضاء ۱۰-۱۱-۱۴۴۵

منزل چهارم، تعمیر پست و پارسل، وزارت مخابرات و خدمات های مخابراتی، محمد

جان شماره تماس: +93 (0) 20 210 44 40



شرایط عمومی قرارداد

الف: عمومیات	
ماده 1- تعریفات	1- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند: 1- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند. 2- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده 44 شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند. 3- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند 1 ماده 55 شرایط عمومی قرارداد. 4- قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند 2 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد می باشد. 5- قراردادی: شخص یا شرکته که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد. 6- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است. 7- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیلات بعدی وارده مطابق قرارداد می باشد. 8- روز: روز تقویمی می باشند. 9- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیصدی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 10- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد. 11- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد. 12- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند 1 ماده 35 شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است. 13- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد. 14- اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد. 15- تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در اختیار کار فراهم میگردد.



16- قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.

17- تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.

18- مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.

19- تأسیسات: منضمات امور ساختمانی که دارائی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد.

20- مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسئولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.

21- SCC: به معنی شرایط خاص قرارداد است.

22- ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.

23- گزارش بررسی ساحه: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

24- مشخصات: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات وارده یا تأیید شده توسط مدیر پروژه می باشد.

25- تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد.

26- قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.

27- ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.

28- تعدیل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.

29- امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفاریات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر گردد.




2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکر یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می نماید.	ماده 2- تفسیر
2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.	
2.3 اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردند: 1- موافقتنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات تخنیکی؛ 7- نقشه ها؛ 8- بل احجام کاری؛ و 9- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.	
3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.	ماده 3- زبان و قانون قرارداد
4.1 مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.	ماده 4- تصامیم مدیر پروژه
5.1 مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.	ماده 5- واگذاری
6.1 هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد.	ماده 6- ارتباطات
7.1 قراردادی باید اداره را کتباً در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبلاً در آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسؤولیت های اکمال کنندگان تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.	ماده 7- عقد قرارداد های فرعی

7.2 در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.	
8.1 قراردادی ساحه کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.	ماده 8- سایر قراردادی ها
9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تأیید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.	ماده 9- کارمندان
9.2 مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.	
10.2 اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.	ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی
11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد: 1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از: (1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا پذیر امور ساختمان باشد؛ یا (2) غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی 2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.	ماده 11- خطرات مربوط اداره
11.2 خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار	


 شرکت ساختمانی عزیزی گلوبل
 Adelz Global Construction Company



الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد: 1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛ 2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا 3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.	
12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد.	ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی
13.1 قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤلیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد: 1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛ 2- زیان یا خساره تجهیزات؛ 3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و 4- صدمه شخصی یا مرگ.	ماده 13- بیمه
13.2 قراردادی، پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.	
13.3 در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.	
13.4 هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.	
13.5 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.	
14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.	ماده 14- گزارش تحقیق ساحه
15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.	ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد
16- قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.	ماده 16- قرارداد




ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان	17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده با تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.
ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروژه	18.1 قراردادی مشخصات تخنیکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تأیید ارائه می نماید.
	18.2 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.
	18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسئولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های موقت را متاثر نمی سازد.
	18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.
	18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروژه تأیید گردند.
ماده 19- ایمنی	19.1 قراردادی مسئول ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.
ماده 20- اکتشاف	20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.
ماده 21- ملکیت ساحه	21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.
ماده 22- دسترسی به ساحه	22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد.
ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی	23.1 قراردادی تمام دستاویز مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.
	23.2 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.
ماده 24- منازعه	24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد.
	24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.
ب. کنترل زمان	
ماده 25- پلان کاری	25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانی را جهت تأییدی به مدیر پروژه ارائه نماید.


 شرکت ساختمانی عزیز گلبرگ
 Azil Global Construction Company



25.2 پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیامانده، بشمول هر تغییر در تسلسل فعالیت ها باشد.	
25.3 قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.	
25.4 تأیید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متأثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.	
26.1 مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل ناممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.	ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل
26.2 مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایتی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.	
27.1 در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ بیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و توسط اداره و قراردادی تأیید میگردد.	ماده 27- تسریع
27.2 پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.	
28.1 مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.	ماده 28- تأخیر سفارش شده توسط مدیر پروژه
29.1 اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حوادث مندرج بند 1 ماده 32 می باشد.	ماده 29- جلسات مدیریت
29.2 مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کاپی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.	
30.1 قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد	ماده 30- هشدار زود هنگام


 شرکت ساختمانی عربی گلوبل
 Arabi Global Construction Company



و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.	
30.1 قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.	
ج. کنترل کیفیت	
31- ماده تشخیص نواقص	31.1 مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسئولیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است، بررسی می نماید.
32- ماده آزمایش	32.1 در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.
33- ماده تصحیح نواقص	33.1 مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هر گونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.
	33.2 قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسط مدیر پروژه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می نماید.
34- ماده نواقص تصحیح نشده	34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامينات قراردادی وضع می گردد.
د. کنترل مصارف	
35- ماده بل احجام کاری ¹	35.1 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.
	35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگردد.

¹ در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد با بند 2 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:
بند 1 ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را درجریان 14 روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.
بند 2 ماده 37 در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.

² در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده 38 شرایط عمومی قرارداد با بند 1 ماده 38 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:
بند 1 ماده 38 تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگردد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

شرکت ساختمانی عزیز گل
Ezizi Global Construction Company




ماده 36- تغییر مقدار ²	36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.
ماده 37- اضافه کاری و کم کاری	37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.
ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها	38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.
	38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبلاً ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.
	38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.
	38.4 در صورتیکه به نسبت استجعالیت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می شود.
	38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.
ماده 39- تخمین جریان پول نقد	39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری ³ ، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.
ماده 40- تصدیقنامه پرداخت ها	40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.
	40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.
	40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.
	40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری ⁴ تکمیل شده می باشد.
	40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد.
	40.6 مدیر پروژه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.
ماده 41- پرداخت ها	41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.
	41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.

³ در قرارداد با پرداخت بالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردید؛
⁴ در قرارداد با پرداخت بالمقطع، این عبارت شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول فعالیت می باشد"



41.3 ارقام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.	
42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد: 1- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند 1 ماده 21 شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده است. 2- اداره جدول فعالیت های قراردادی دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متأثر می سازد؛ 3- مدیر پروژه دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تخیکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛ 4- مدیر پروژه دستور برملا ساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که در نتیجه آزمایش، نواقص تثبیت نمی گردد؛ 5- مدیر پروژه بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛ 6- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛ 7- مدیر پروژه دستور حل وضعیت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل ایمنی یا سایر دلایل لازم باشد؛ 8- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛ 9- تأخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره 10- تأثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ 11- تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلائل نا معقول از جانب مدیر پروژه؛	ماده 42- وقایع قابل جبران
42.2 در صورت وقوع حائث قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می گردد. مدیر پروژه تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.	
42.3 در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.	
43.1 مدیر پروژه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی (BRT)، و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید. این تعدیل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبلاً در قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.	ماده 43- مالیه
44.1 در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.	ماده 44- اسعار
45.1 تعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط	ماده 45- تعدیل قیم



خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.	
46.1 اداره الی ختم تمام کار ، قسمتی از پول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.	ماده 46- تأمینات
46.2 تأمینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گزینی، وراثتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.	
47.1 جریمه تأخیر به نرخ فی روز مندرج شرایط خاص قرارداد برای روز های تأخیر محاسبه میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتم طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جریمه تأخیر تاثیری بر مسئولیت های قراردادی ندارد.	ماده 47- جریمه تأخیر
47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تأخیر، مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تأخیر توسط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.	
48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مکافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است) شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است تصدیق می نماید.	ماده 48- مکافات
49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکانه وضع نمیکردد.	ماده 49- پیش پرداخت
49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کاپی های انوایس ها یا دیگر اسناد را به مدیر پروژه ارائه می نماید.	
49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعدیل قیم، حادثه قابل جبران، مکافات، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.	
50.1 داوطلب برنده در مدت 10 روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.	ماده 50- تضمینات



[Handwritten signature]



51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.	ماده 51 - مزد کار
51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فورمه های تأیید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.	
51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.	
52.1 قراردادی بمصرف خود، مسئولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.	ماده 52- مصارف ترمیم
ح. اختتام قرارداد	
53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید.	ماده 53- تکمیل
54.1 اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.	ماده 54- تسلیمی
55.1 قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروژه در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروژه تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.	ماده 55- حساب نهایی
56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید.	ماده 56- رهنمود عملیاتی و مراقبت
56.2 در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده شرایط خاص قرارداد از جانب قراردادی یا عدم تأییدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.	



Handwritten signature



57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ می‌گردد.	ماده 57- فسخ قرارداد
57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد: 1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تأیید نگردیده باشد؛ 2- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصراف از این دستور صورت نگرفته باشد؛ 3- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی 4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛ 5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و 6- در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.	
57.3 علرغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.	
57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.	
58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد.	ماده 58- فساد و تقلب
58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج می‌گردد.	



[Handwritten signature]

58.3 اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و

اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:

1- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر⁵ (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.

2- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.

3- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر⁶ داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

4- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

5- ایجاد اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.

اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (1) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.

58.4 هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهاییکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.

59.1 در صورت فسخ قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده الی تاریخ صدور تصدیقنامه و فیصدی قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل نشده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می نماید. جریمه تأخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش

ماده 59- پرداخت
بمحض فسخ

⁵ به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.
⁶ به شرکت کننده های پروسه تدارکات (بشمول مقامات دولتی) که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند، اطلاق میگردد.



Handwritten signature and initials.



پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد. 59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصدیقنامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفریق پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور تصدیقنامه را صادر می نماید.	
60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.	ماده 60- ملکیت
61.1 در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترل اداره یا قراردادی متأثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیقنامه و کار ها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد.	ماده 61- عدم امکان تطبیق قرارداد
62.1 حل منازعه بطور دوستانه: 1- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 64.1 مرجع حل و فصل منازعات: 2- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مرجع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد. 64.2 حکمیت: 3- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (28) روز از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.	ماده 62- حل منازعه



شرایط خاص قرارداد

{اداره این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه پری مینماید. معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند}	
مواد شرایط عمومی قرارداد	تعدیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسایل عمومی	
جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	میعاد رفع نواقص {به مدت 2 دو ماه} میباشد. • میعاد رفع نواقص بعد از تکمیل و تسلیمی مدت دو 2 ماه میباشد. • میعاد تعویض جنس مدت 20 روز • میعاد ورنتی جنس مدت 12 ماه بعد از نصف و انیستالیش آغاز میگردد. • مدت کار آئی جنس حد اقل 20 سال میباشد. نوت: جنس مورد نیاز باید دارای اسناد حمایتی، منبع تولید کننده، داشتن ورنتی و میعاد کار آئی جنس تذکر گردیده باشد.
جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	اداره {شرکت مخابراتی افغان تیلی کام- وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی} میباشد
جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی شامل کندنکاری و پایپ انداز به مدت هفت ماه (7) بعد از صدور مکتوب آغاز کار می باشد. نوع قرارداد: بالمقطع
جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	مدیر پروژه : صلاحیت مدیریت و نظارت پروژه را معاونیت عملیاتی سیمدار به عهده دارد و این معاونیت نظر به لزوم دید، مدیر نظارتی پروژه را به شکل مستقیم و یا از طریق مدیریت زون های مربوطه تعیین و معرفی مینماید.
جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	کندنکاری و پایپ اندازی هر لات در مسیر های مشخص شده صورت میگیرد و ساحه کاری هر لات در مشخصات کاری ضمیمه شده تثبیت و مشخص گردیده است.



[Handwritten signature]




تاریخ آغاز کار امور ساختمانی { بعد از صدور مکتوب اجازه آغاز کار } می باشد.	جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
کندنکاری و پایپ اندازی { در بل احجام کاری و مشخصات کاری ضمیمه شده مشخص گردیده است	جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تکمیل قسمت وار { قابل تطبیق نیست } می باشد. نوت: تکمیل کار هر لات پروژه در خلال مدت معینه طبق جز 17 بند 1 ماده 1	بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد
اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند. 1. موافقتنامه قرارداد 2. شرایط خاص قرارداد 3. شرایط عمومی قرارداد 4. نقشه ها 5. بل احجام کاری	جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد
زبان قرارداد { دری } می باشد.	بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد
قانون نافذ بر این قرارداد { قانون نافذ افغانستان } می باشد.	
جدول فعالیت های قراردادی دیگر { قابل تطبیق نیست } می باشد.	بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد



[Handwritten signature]



بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد	طبق جدول زیر، داشتن کارمندان ذیل غرض تطبیق لازمی و ضروری میباشد: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>کارمند کلیدی</th> <th>درجه تحصیل</th> <th>حد اقل تجربه کاری مشابه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>یک نفر سوپروایزر</td> <td>لیسانس از بخش ساختمانی</td> <td>حد اقل سه سال تجربه مشابه در بخش شیوه های کندنکاری ها، نصب هنجول ها و غیره</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>یک نفر کارمند تخریکی مخابراتی در بخش پایپ و کیبل انداری فایبر نوری</td> <td>لیسانس از بخش مخابراتی</td> <td>حد اقل دو سال تجربه در بخش مربوطه</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>دو نفر کارمند تخریکی بخش شبکه فایبر نوری</td> <td>فارغ صنف 12 و یا بالاتر از آن</td> <td>حد اقل دو سال در بخش سپلایسنگ، پاور متر، لایت سور و ماشین اوتی دی آر</td> </tr> </tbody> </table> تجهیزات ضروری غرض تطبیق پروژه برای هر لات از جانب داوطلب برنده طور ذیل تهیه گردد: بیل، کلند، جبل، کراچی دستی، ماشین، ماشین کمپکشن، ماشین قطع کانکریت و قیر، ماشین میکسر کانکریت، تانکر آب، سکواتور، کیبل راد، واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی، البسه محافظوی کارگران و غیره وسایل و سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت نظر به پروژه های ساختمانی، داشته باشد.	ردیف	کارمند کلیدی	درجه تحصیل	حد اقل تجربه کاری مشابه	1	یک نفر سوپروایزر	لیسانس از بخش ساختمانی	حد اقل سه سال تجربه مشابه در بخش شیوه های کندنکاری ها، نصب هنجول ها و غیره	2	یک نفر کارمند تخریکی مخابراتی در بخش پایپ و کیبل انداری فایبر نوری	لیسانس از بخش مخابراتی	حد اقل دو سال تجربه در بخش مربوطه	3	دو نفر کارمند تخریکی بخش شبکه فایبر نوری	فارغ صنف 12 و یا بالاتر از آن	حد اقل دو سال در بخش سپلایسنگ، پاور متر، لایت سور و ماشین اوتی دی آر
ردیف	کارمند کلیدی	درجه تحصیل	حد اقل تجربه کاری مشابه														
1	یک نفر سوپروایزر	لیسانس از بخش ساختمانی	حد اقل سه سال تجربه مشابه در بخش شیوه های کندنکاری ها، نصب هنجول ها و غیره														
2	یک نفر کارمند تخریکی مخابراتی در بخش پایپ و کیبل انداری فایبر نوری	لیسانس از بخش مخابراتی	حد اقل دو سال تجربه در بخش مربوطه														
3	دو نفر کارمند تخریکی بخش شبکه فایبر نوری	فارغ صنف 12 و یا بالاتر از آن	حد اقل دو سال در بخش سپلایسنگ، پاور متر، لایت سور و ماشین اوتی دی آر														
بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد	مبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: 1- برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} میباشد. 2- برای زیان یا خساره به تجهیزات {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} میباشد. 3- برای زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} می باشد. 4- مرگ یا خساره به کارمندان: (1) کارمندان قراردادی {مقدار به ارقام و حروف درج گردد} میباشد. (2) افراد دیگر {مقدار به ارقام و حروف درج گردد} می باشد.																
بند 1 ماده 14 شرایط عمومی قرارداد	گزارشات بررسی ساحه {قابل تطبیق نیست} میباشد.																
بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد	قابل تطبیق نیست																



تاریخ تسلیمی ساحه 14 روز بعد از مکتوب آغاز کار می باشد. تاریخ تسلیمی ساحه در همکاری و هماهنگی معاونیت عملیاتی سیمدار با قراردادی صورت میگیرد نوت: معاونیت عملیاتی سیمدار- شرکت مخابراتی افغان تیلی کام مکلف است طور کتبی ساحه کار هر لات را به قراردادی طور کتبی تسلیم نماید. قرار دادی مکلف است بعد از تسلیمی رسمی ساحه در خلال پنج ماه تکمیل نماید.	بند 1 بند 21 شرایط عمومی قرارداد
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد {مرکز حل و فصل منازعات تجارتی افغانستان} میباشد.	ماده 62 شرایط عمومی قرارداد
ب. کنترل زمان	
قراردادی پلان کاری امورساختمانی را در جریان 6 روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر جهت تأییدی، ارائه مینماید.	بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 5 روز میباشد. قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت 6 روز، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده، از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.	بند 3 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
ج. کنترل کیفیت	
میعاد رفع نواقص به مدت 2 دو ماه میباشد. • میعاد رفع نواقص هر لات بعد از تکمیل و تسلیمی، آغاز و برای مدت دو 2 ماه میباشد. • میعاد تعویض جنس مدت 20 روز • میعاد ورتنی جنس مدت 12 ماه بعد از نصف و انیستالیش آغاز میگردد. • مدت کار آئی جنس حد اقل 20 سال میباشد. نوت: جنس مورد نیاز باید دارای اسناد حمایتی، منبع تولید کننده، داشتن ورتنی و میعاد کار آئی جنس تذکر گردیده باشد.	بند 1 ماده 33 شرایط عمومی قرارداد



[Handwritten signature]



بند 1 ماده 34 شرایط عمومی قرارداد	در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامينات قراردادی وضع می گردد
د. کنترل مصرف	
بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد	قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعدیل { "نیست" } و معلومات ذیل در مورد ضرایب { "قابل تطبیق نیست" } می باشد. ضرایب تعدیل قیم قرارداد ذیل میباشند: برای واحد پول افغانی: ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد. ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد. به واحد پول { واحد پولی درج گردد }: ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد. ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد. شاخص 1 به واحد پول افغانی { شاخص درج گردد } می باشد. شاخص 1 به واحد پولی بین المللی مشخص شده { شاخص درج گردد } می باشد. { این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد } شاخص 1 اسعار به استثنای واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی { شاخص درج گردد } می باشد. { این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد }
بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد	فیصدی تناسب پرداخت های تامينات 5 فیصد می باشد. تامينات بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی و میعاد ورنی جنس و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.
بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد	نظر فرمان شماره 1470 مؤرخ 1444/5/9 عاالقدرامیر المؤمنین که چنین صراحت دارد: ".... تعذیر باخذالمال ختم کری"، جریمه تاخیر قابل تطبیق نمی باشد.
بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد	انعام برای انجام تمام امور ساختمان صفر فیصد قیمت نهایی قرارداد در فی روز می باشد. حد اعظمی انعام برای انجام تمام امور ساختمان صفر فیصد قیمت نهایی قرارداد می باشد. قابل تطبیق نیست




بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد	پرداخت ها برای هر لات به اقساط ذیل صورت میگیرد: 1. از مجموعی قیمت قرارداد مبلغ سی (30) فیصد آن در مقابل تضمین بانکی طور پیش پرداخت صورت میگیرد 2. قسط اول : بعد از اجرا و تصدیق سی (30) فیصد کار و تائیدی مدیر پروژه مبلغ (20) بیست فیصد پرداخت صورت میگیرد . 3. قسط دوم : بعد از اجرا و تصدیق سی (30) فیصد کار و تائیدی مدیر پروژه مبلغ (20) بیست فیصد پرداخت صورت میگیرد . 4. قسط سوم: بعد از اجرا و تصدیق سی (40) فیصد کار و تائیدی مدیر پروژه مبلغ (20) بیست فیصد پرداخت صورت میگیرد . 5. در آخر مبلغ ده (10) فیصد باقیمانده بعد از تکمیلی و تسلیمی نهایی پروژه پرداخت صورت میگیرد
بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد	مبلغ تضمین اجرا مبلغ 5٪ از مجموع قیمت قرار داد برای هر لات میباشد. تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی میباشد. تضمین اجرا به مدت 7 ماه جمع (28) روز باید اعتبار داشته باشد.
بند 2 ماده 52 شرایط عمومی قرارداد	قراردادی بمصرف خود، مسئولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم معیاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.
هـ - ختم قرارداد	
بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	چک لست سایت ها و نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ معینه مندرج مشخصات تخیکی تهیه و برای مالک پروژه تسلیم مینماید.
بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 ز پرداخت صورت نمیگیرد
جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد	حد اکثر تاخیر 28 روز میباشد.




بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد	فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل نشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمان 10 فیصد میباشد.
---	--

نقشه و دیزاین

دیزاین پروژه به شکل جداگانه ضمیمه قرارداد میباشد

لات سوم					
بل احجام کاری از شهر زرنج الی 77 کیلومتری طرف ولسوالی غورغوری)					
شماره	مشخصات تخنیکی	واحد	اندازه / ارقام	قیمت فی واحد به عدد	قیمت مجموعی به افغانی
1	کندنکاری؛ پایپ و کیبل اندازی ساحات عادی مطابق رهنمود شماره 5.1	متر	76,000	140	10,640,000
2	کندنکاری؛ پایپ و کیبل اندازی ساحات سیل برد مطابق رهنمود شماره 5.3	متر	50	180	9,000
3	کندنکاری؛ پایپ و کیبل اندازی ساحات بورینگ مطابق رهنمود شماره 5.4	متر	700	200	140,000
4	اعمار هندحول مطابق رهنمود شماره 5.5	باب	3	120,000	360,000
5	نصب هندحول HDPE یا فایبر گلاس معه ای دی بال مطابق رهنمود شماره 6.5	باب	71	1,500	106,500
6	پایپ محافظوی (HDPE) Ductwith Tracer Wire مطابق رهنمود شماره 5.8	متر	76,750	96	7,368,000
7	پایپ محافظوی (HDPE) مطابق رهنمود شماره 5.9	متر	230,250	71	16,347,000
8	هندحول HDPE یا فایبر گلاس مطابق رهنمود شماره 5.10	باب	85	12,000	1,020,000
9	Electrical Telecom IDBall مطابق رهنمود شماره 5.11	عدد	85	2,000	170,000
10	Plastic Spacer مطابق رهنمود شماره 5.12	عدد	2,000	100	200,000
			قیمت مجموعی به عدد (افغانی)		
			36,361,250		
			قیمت مجموعی به حروف		
			سی و شش میلیون سه صد و شصت یک هزار و دو صد و پنجاه افغانیر		

نوټ: متراژ کندن کاری ساحه عادي، سخره و کوه زار و سیل برد در ردیف های 1, 2 و 3 بل احجام کاری سنجش و درج گردیده است.

طوریکه در بل احجام کار بخش های کندن کاری ساحه عادي سخره و کوه زار و سیل برد برای قیمت د هی طور دقیق محاسبه گردیده اما با آن هم چون عمق زمین قابل پیش بینی نیست در صورت که ساحات که عادي بر آورد گردیده ساحات سخره بمیان آمید داوطلب (قراردادی) رسم موضوع را با شرکت افغان تیلی کام در میان گذاشته تا یک هیئت در مورد توظیف و بعد از گزارش هیئت موظف نظر به متر از ساحه محاسبه و مجرا میگردد.



[Handwritten signature]



مشخصات تخنیکي پروژه

Scope of Work

تعمید کیبل فایبر نوری از ولایت هرات ولسوالی کرخ الی ولایت بادغیس ولسوالی غورماچ

1. معرفی شرکت افغان تیلی کام :

افغان تیلی کام بتاريخ 13 سپتمبر سال 2005 میلادی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود. شرکت افغان تیلی کام بعد از تأسیس خدمات موبایل GSM/3G سلام ، خدمات فایبرنوری ، خدمات تلفون های دیجیتال لیندار ، خدمات انترنیت DSL ، خدمات انترنت وایمکس ، خدمات انترنت Dial Up را در سطح کشور عرضه میدارد.

2. پس منظر پروژه و شبکه فایبر نوری:

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام با ارائه خدمات مخابراتی توانسته است سرتاسر کشور را تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دهد که طبق نیازمندی مارکیت و تکنالوژی گام پیشرفت و ترقی جهت تأمین خدمات مورد نیاز مارکیت (Optical Fiber Cable (OFC)) را در پهلوی شبکه های قبلی خویش، شبکه رینگ حلقوی فایبر نوری به ظرفیت 36 Core فایبردر ۲۵ ولایت کشور جهت ارتباط دستگاه های مخابراتی این شرکت به دستگاه های مرکزی به شبکه کیبل فایبر نوری (OFC) بابت تأمین خدمات مخابراتی بهتر و با کیفیت، احداث و فعال نمود است. ضمن اینکه شبکه خویش را تحت نام Access Network ولایات شمال شرق و مرکزی کشور را مانند بامیان، کندز، بدخشان، تخار، کنر و کاپیسا را به شبکه رینگ حلقوی به ظرفیت 36 Core فایبر ولایات جنوبی مشمول ولایات لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست را نیز به ظرفیت 36 Core فایبر به رینگ حلقوی، وصل نموده است.

3. هدف پروژه:

یکی از اهداف شرکت مخابراتی افغان تیلی کام گسترش و توسعه شبکه فایبر نوری در تمام ولایات کشوری باشد که از جمله ۳۴ ولایات فعلاً ۲۵ ان به شبکه فایبر نوری وصل و ۹ ولایت دیگر تحت پلان توسعه قرار داشته و در آینده نزدیک از خدمات و امکانات شبکه فایبرنوری مستفید خواهد گردید اکنون هدف خاص تطبیق پروژه مسیر متذکره نیازمندی مبرم با در نظر داشت موارد ذیل به منظور فراهم نمودن امکانات مکالماتی و انترنتی به ولایات که از لینک متذکره وصل خواهد گردید، ترجیح داده و انرا تحت اولویت قرار میدهد.


- تکمیل نمودن رینگ فایبر نوری به سطح کشور؛
- پایدار نمودن خدمات مخابراتی به شکل شبکه رینگ و لینک محافظی؛
- فراهم نمودن خدمات مخابراتی از طریق شبکه فایبر نوری با ولایت بادغیس و ولسوالیهای که در مسیر میباشد؛
- فراهم نمودن خدمات مخابراتی از طریق فایبر نوری به مشترکین FTTH؛
- فراهم نمودن امکانات مکالماتی و انترنتی به دواير دولتي و خصوصي از طریق شبکه فایبرنوری؛
- فراهم نمودن خدمات با کیفیت و سرعت بالا (3G & 4G) به شبکه های مخابراتی؛



- تأمین و پایدار نمودن شبکه موجوده توسط تمدید کیبل فایبر نوری و مساعد نمودن خدمات مخابراتی بطور ترانزیت با کشورهای همسایه و بین الایلی.

4. مشخصات/ نیازمندی: قسمت هشتم شرطنامه تحت عنوان بل احجام کاری موجود است

5. نیازمندی/ روش کندنکاری و تطبیق پروژه:

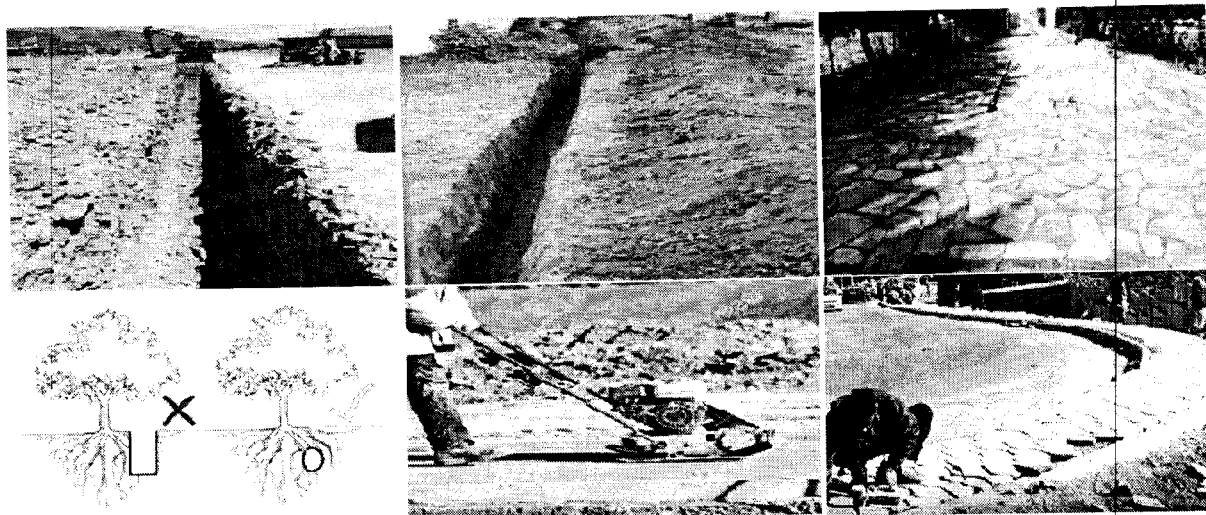


5.1 روش کندنکاری در ساحات عادی (خامه):

- کندن کاری به عمق (200 cm)؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غریل شده) به ضخامت (10cm)؛
- پایپ اندازی دو جوهره (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غریل شده) به ضخامت (20cm) بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمة درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت (50cm)؛
- فرش فیه خطر بعد از (70cm) پرکاری؛
- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ؛
- در ساحات که بیدون شلدر سرک امکان کندنکاری نباشد، کندنکار طوری صورت گیرد تا سرک و جویچه تخریب نگردد.




Handwritten signature and initials.



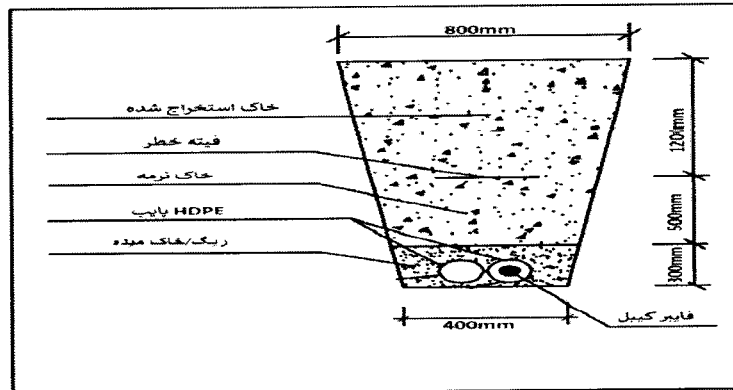

5.2 روش کندنکاری ساحات سخره و کوهزار:

- کندن کاری به عمق (180 cm)؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میله (غریبل شده) به ضخامت (10cm)؛
- پایپ اندازی دو جوهره (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- فرش از ریگ/خاک میله (غریبل شده) به ضخامت (20cm) بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت (50cm)؛
- فرش فیتة خطر بعد از (70cm) پرکاری؛
- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ.

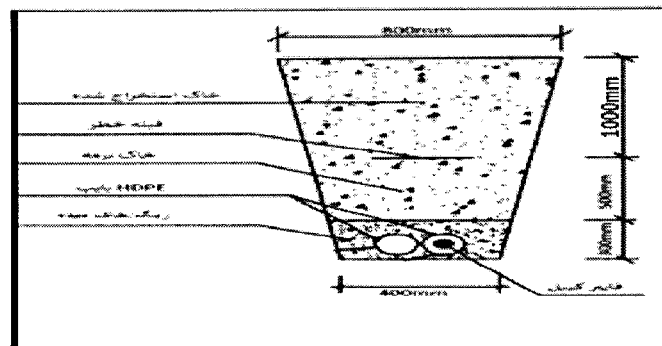


5.3 روش کندنکاری ساحات سیل برد:

- کندن کاری به عمق (300 cm)؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میله (غریبل شده) به ضخامت (10cm)؛
- پایپ اندازی دو جوهره (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- فرش از ریگ/خاک میله (غریبل شده) به ضخامت (20cm) بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت (50cm)؛
- فرش فیتة خطر بعد از (70cm) پرکاری؛




- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- کیل اندازی توسط ماشین کیل بلوینگ.

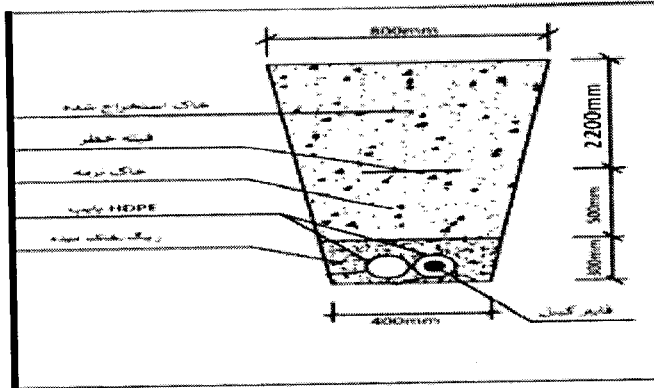


5.4 روش کندنکاری ساحات بورینگ:

- کندن کاری به عمق (200 cm)؛
- بور نمودن ساحات به قطر $6 \text{ inch} \pm 20\%$ طور افقی؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غریبل شده) به ضخامت (10cm)؛
- پایپ اندازی دو جوهره (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غریبل شده) به ضخامت (20cm) بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت (50cm)؛
- فرش فیلته خطر بعد از (70cm) پرکاری؛
- پرکاری مکمل ساحه کندنکاری شده، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- کیل اندازی توسط ماشین کیل بلوینگ؛
- در مسیر سرک و تپه ها ضرورت بردارد، نیاز به ماشین HDD است.


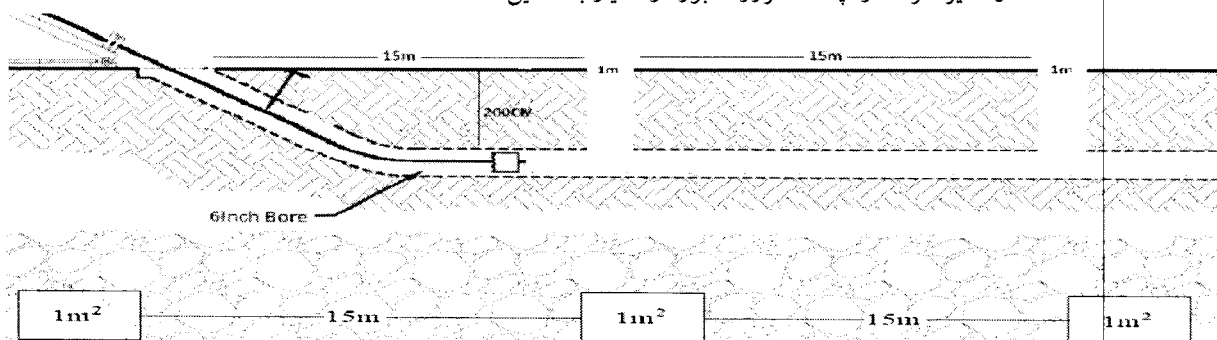


5.5 اعمار هندحول:

- کندن کاری برای اعمار هندحول به اندازه ذیل:




- عمق 240 سانتی متر؛
- عرض 190 سانتی متر؛
- طول 190 سانتی متر.
- اعمار نمودن هندحول با ابعاد ذیل مطابق مشخصات درج شده شکل شماره 4:
 - عمق 180 سانتی متر؛
 - عرض 120 سانتی متر؛
 - طول 120 سانتی متر.
- کانکریت:
 - یک قسمت سیمنت؛
 - دو قسمت ریگ ماسه؛
 - یک قسمت جغل (کرش بادامی)؛
- تهیه سقف هندحول هم سطح زمین / پیاده رو؛
- درج نقاط GPS هندحول در جدول؛
- تمديد پایپ (HDPE) از وسط دیوار هندحول طبق نقشه شماره 4؛
- تمام GPS point هندحول ها درج جدول؛
- تهیه و نصب سرپوش چودنی قفل دار به وزن 100 کیلوگرام، چپ راست دار معه ماستر کلید؛
- نصب براکت و فوم نمودن سرپایپ در هندحول و فایبر گلاس.

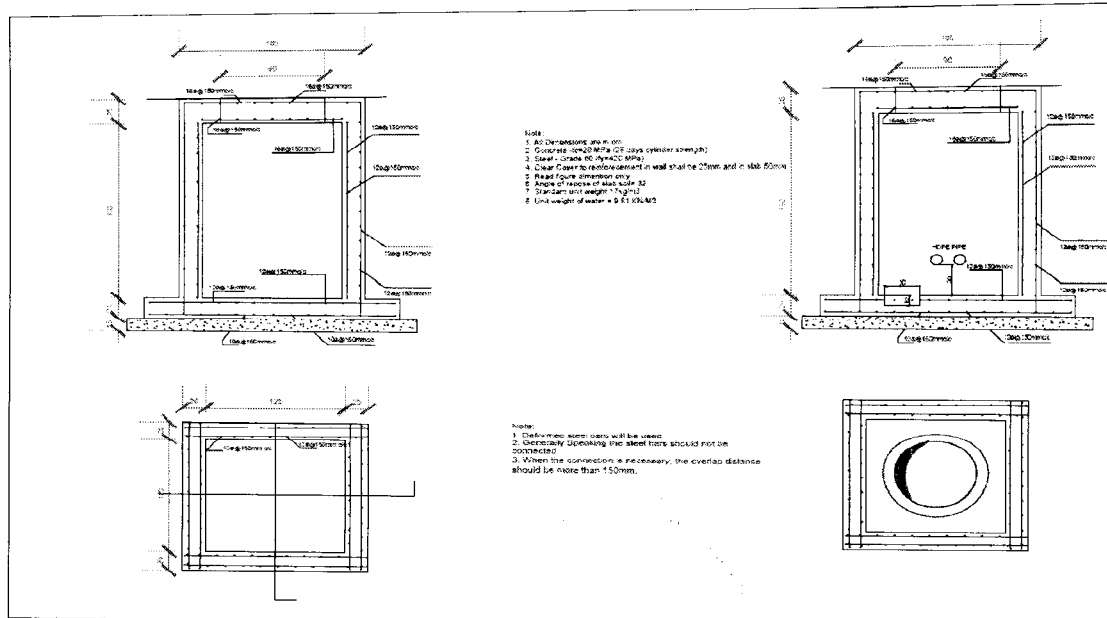

5.6


نصب نمودن فایبر گلاس:

- کندن کاری به ابعاد اندازه فایبر گلاس و مطابق عمق کندنکاری (200cm)؛
- وصل نمودن پایپ با فایبر گلاس؛
- فوم نمودن سرپایپ در فایبر گلاس و نصب نمودن ID Ball؛
- کیبل اندازی بر کردن داخل فایبر گلاس توسط ریگ میده یا خاک غریبل شده؛
- دو لایه چیدن خشت مطابق شکل 7؛
- پرکاری و ترمیم دوباره ساحات تخریب شده به حالت اولی ان؛
- تمام GPS point فایبر گلاس ها با دقت ان در حدود ۱۰ سانتی متر درج جدول.

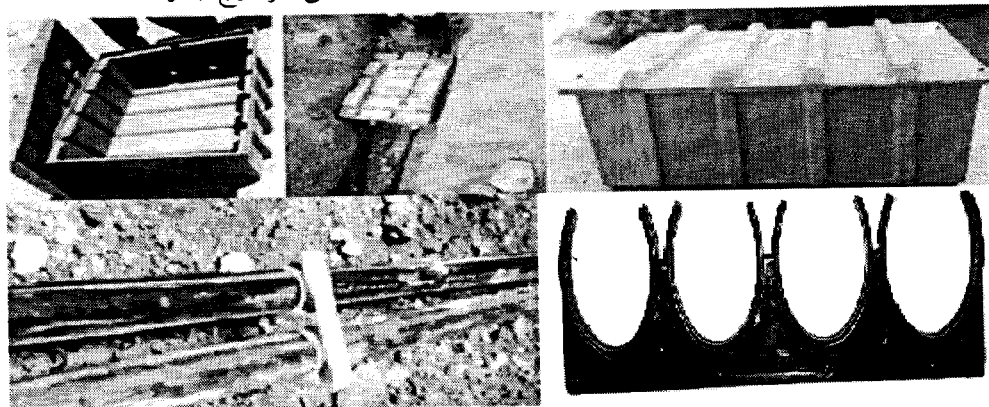

5.7 نصب پایپ اهنی در پل:

- پایپ اهنی چهار انچ مطابق شکل 8 نصب گردد و کلیپ نمودن ان در هر یک متر؛
- ضخامت $3\text{mm} \pm 10\%$ باشد.

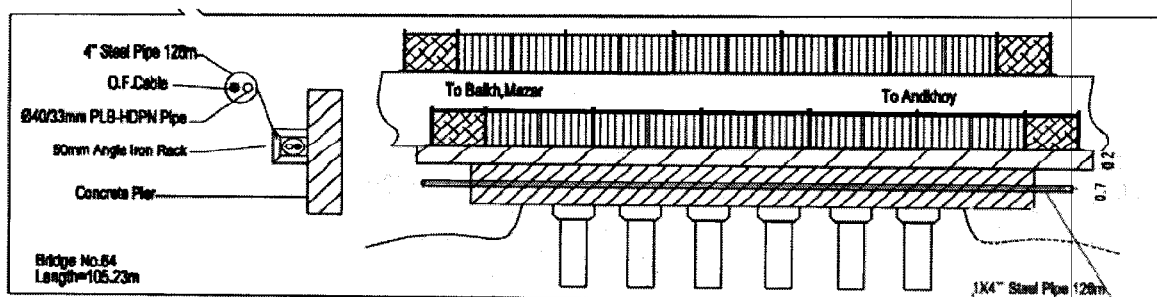


[Handwritten signature]



5.8 روش کندنکاری ساحات تپه های کوهی و بورینگ ان:

- بور نمودن ساحات تپه های خاکی توسط ماشین HDD؛
- بور نمودن ساحات به قطر $6 \text{ inch} \pm 20\%$ طور افقی؛
- پایپ اندازی دو جوره (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ؛
- بور نمودن ساحه توسط ماشین با عمق 15 الی 20 متر و طول ان از 50 الی 200 متر.




5.9 تهیه نمودن پایپ محافظی :

(HDPE) Duct with Tracer Wire

- The HDPE Duct shall be suitable for cable laying by blowing / pulling technique;
- Appropriate non-metallic couplers (connecting sockets) will be used to join two pieces of HDPE ducts for a locked and air sealed assembly;
- HDPE drum should be 2km;
- HDPE pipes shall meet the international standards and satisfy the following technical specification
- 100% Polyethylene raw materials;
- black color;
- Double layer pipe;
- The nature material of the; outer layer shall be polyethylene pipe;
- The thickness of the outer layer shall be 2.5mm;
- The thickness of the inner layer shall be 1.2mm;
- The color of the inner layer of the pipe should be white;
- The thickness of both layers should be 3.7mm;
- The inner should be Silicone material and diameter of the pipe should be 36.3 mm;
- The outer diameter of the pipe should be 40 mm;
- The weight per meter should be 430 grams;
- The pressure tolerance should be 16 bar or better;
- The length of each pipe should be 2 km, pieces is not acceptable in the drum;
- On the outer layer of pipe, name of Afghan Telecom and length (Meter) should be mentioned.
- HDPE Duct with Tracer Wire is a revolutionary HDPE Duct with built-in detect-ability;
- Detector wire should be 100% pure copper with 1mm diameter;
- Tracer Wire carries a co-extruded HDPE encased copper wire, which acts as a corrosion proof conductor and provides complete detect-ability in use with multiple frequency locator.

5.10 تهیه پایپ محافظی (HDPE) Duct

- The HDPE Duct shall be suitable for cable laying by blowing / pulling technique;
- Appropriate non-metallic couplers (connecting sockets) will be used to join two pieces of HDPE ducts for a locked and air sealed assembly;
- HDPE drum should be 2km;



- HDPE pipes shall meet the international standards and satisfy the following technical specification
- 100 % Polyethylene raw materials;
- black color;
- Double layer pipe;
- The nature material of the; outer layer shall be polyethylene pipe;
- The thickness of the outer layer shall be 2.5mm;
- The thickness of the inner layer shall be 1.2mm;
- The color of the inner layer of the pipe should be white;
- The thickness of both layers should be 3.7mm;
- The inner should be Silicone material and diameter of the pipe should be 36.3 mm;
- The outer diameter of the pipe should be 40 mm;
- The weight per meter should be 430 grams;
- The pressure tolerance should be 16 bar or better;
- The length of each pipe should be 2 km, pieces is not acceptable in the drum;
- On the outer layer of pipe, name of Afghan Telecom and length (Meter) should be mentioned.

5.11 تهیه نمودن هندحول HDPE یا فایبر گلاس:

- Dimension: 1030*520*360 (mm) $\pm 10\%$;
- Weight: 32 kg;
- Resist pulling intensity: 313 MPa;
- Resist band intensity: 235 MPa;
- Resist Pressure Intensity: 245 MPa;
- In the event that the supplier notices discrepancies above and would want update according to their specific equipment/material configuration shall notify Afghan Telecom.

5.12 تهیه نمودن Electrical Telecom ID Ball

- Marker Depth: 1.5-2m;
- Utility Type: Telephone;
- Marker Function: Passive.

5.13 تهیه نمودن Plastic Spacer

- Material – Polyethylene Size Suitable Plastic Spacer Four Way.



6. مسولیت های فرمایش دهنده و فرمایش گیرنده:

شماره	مسولیت ها	فرمایش دهنده	فرمایش گیرنده
کار ساختمانی:			
1	تعیین و مشخص نمودن ساحه و مسیر برای کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی؛	√	
2	اجازه بمنظور تطبیق نیازمندی/ پروژها در ساحات مورد نیاز از اورگانهای دولتی و حل معضلات با نهادها زیر ربط (امنیتی، فواید عامه)؛	√	
3	تهیه کتاب ژورنال به منظور معلومات روزمره از پیشرفت و نواقص کار؛	√	
4	اندازه گیری ساحات تطبیق شده؛	√	
5	وصل و جابجایی کیبل فایبر نوری؛	√	
6	وصل و نصب ODF در سایت ها؛	√	
7	تهیه و تسلیم نمودن اجناس (پیپ HDPE، فایبر گلاس یا هندحول HDPE، کیبل فایبر نوری، ای دی بال، Pipe Spacer و فیته خطر) به قراردادی؛	√	
8	چک و امتحان کیبل توسط ماشین OTDR و ارایه گزارش از هر فایبر (Cores)؛	√	
9	نصب نمودن HDPE pipe spacers در هر 40m به شکل معیاری؛		√
10	انتقال اجناس مورد نیاز (پیپ HDPE، فایبر گلاس یا هندحول HDPE، کیبل فایبر نوری، ای دی بال، Pipe Spacer و فیته خطر) از گدام شرکت مخابراتی افغان تلیکام مربوط زون بادغیس الی ساحه کار؛		√
11	تعیین و معرفی نماینده قراردادی منحیث ناظر با صلاحیت جهت نظارت از پیشرفت کار و حل مشکلات؛		√
12	ارایه گزارش از پیشرفت کار به طور روزانه و هفته وار به کار فرما (شرکت افغان تلیکام)؛		√
13	تهیه نقشه نهایی (As Build Drawing of GIS or Auto CAD) با موقعیت GPS فایبر گلاس و هندحول؛		√
14	تامین امنیت کارمندان و کارگران به منظور تطبیق پروژها؛		√
15	کیبل باید توسط ماشین کامپریسور با استفاده از درم جگ تمدید گردد و بدون ماشین کامپریسور قابل قبول نمیباشد (قراردادی میتواند از ماشین شرکت افغان تلیکام به طور امانت استفاده و بعد از ختم کار به شرکت افغان تلیکام تسلیم نماید، در صورت ماشین کامپریسور افغان تلیکام مشکل تخنیکی داشته باشد شرکت قراردادی میتواند مشکل را رفع نموده و از آن استفاده نماید)؛		√
16	جلو گیری از گره خوردن (bend radius) کیبل فایبر نوری و تمدید آن به طور دقیق و مسلکی؛		√
17	چک و امتحان پایپ ها و (HDPE) Duct Tracer Wire در حضورداشت نماینده شرکت افغان تلیکام غرض جلو گیری از مسدود بودن آن؛		√
19	در جریان کار و تمدید کیبل فایبر نوری ملکیت های عام المنفعه متضرر نشود، طوریکه ارایه گردید تمام ساحات کندنکاری شده مطابق مشخصات کندنکاری بعد پرکاری و ترمیم دوباره ساحات قبلی شده به حالت اولی آن برگردد؛		√
20	در صورت نیاز به مسدود کردن کیبل فایبر نوری		√

میعاد قرارداد طور ذیل می باشد:

میعاد قرارداد به مدت 7 ماه تقویمی بعد از عقد قرارداد می باشد.

Project timeline for each section (lot)																											
ID	Route Name	Activity	Duration/Week	Start Week	End Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	تړنگول بېجه ولسوالۍ څرخ لاسي لمر ټولن-سټرېک	Administrative procedure	1	1	1																						
		Delivering equipment to work	1	2	3																						
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																						
		Cable blowing	1	15	16																						
		link test	1	17	18																						
		Review of work completion and report	1	19	20																						
		handover of project	1	21	22																						
2	ټړنگه نو لمر ټولن-سټرېک	Administrative procedure	1	1	1																						
		Delivering equipment to work	1	2	3																						
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																						
		Cable blowing	1	15	16																						
		link test	1	17	18																						
		Review of work completion and report	1	19	20																						
		handover of project	1	21	22																						
3	ټړنگه نو لمر ټولن-سټرېک	Administrative procedure	1	1	1																						
		Delivering equipment to work	1	2	3																						
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																						
		Cable blowing	1	15	16																						
		link test	1	17	18																						
		Review of work completion and report	1	19	20																						
		handover of project	1	21	22																						
4	ټړنگه نو لمر ټولن-سټرېک	Administrative procedure	1	1	1																						
		Delivering equipment to work	1	2	3																						
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																						
		Cable blowing	1	15	16																						
		link test	1	17	18																						
		Review of work completion and report	1	19	20																						
		handover of project	1	21	22																						
5	ټړنگه نو لمر ټولن-سټرېک	Administrative procedure	1	1	1																						
		Delivering equipment to work	1	2	3																						
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																						
		Cable blowing	1	15	16																						
		link test	1	17	18																						
		Review of work completion and report	1	19	20																						
		handover of project	1	21	22																						

11. تفتیش بصری برای:

آزمایش و معاینه توسط هیئت معاینه طور ذیل صورت میگیرد:

تفتیش و معاینه بصری

تفتیش و معاینه فزیک

معاینه عملیاتی (در صورت ضرورت)

معاینه تخنیک

معاینه تخنیک در ولایت مربوطه ساحه کار مربوطه با حضورداشت نماینده طرفین ذیلاً صورت میگیرد:

- حصول اطمینان از برداشت بار (Load) پای و غیره زیر نظر فرمایش گیرنده از جانب فرمایش دهنده (شرکت مخابراتی افغان





مجلسی کام) صورت میگیرد.

توسعه معاینات در مطابقت به مشخصات داده شده در صورت که ایجاب کند، توسط هیئت معاینه صورت خواهند گرفت

نوع: ... شرکت ساختمانی عزیزی گلپول ۴۵ ... دارالانشاء ...

Handwritten signature



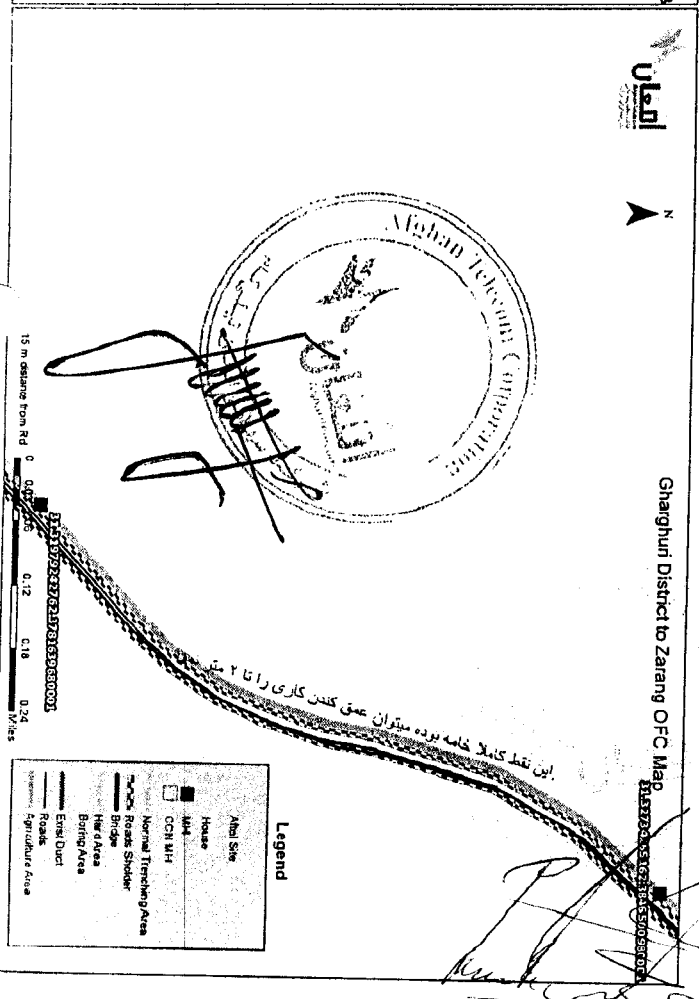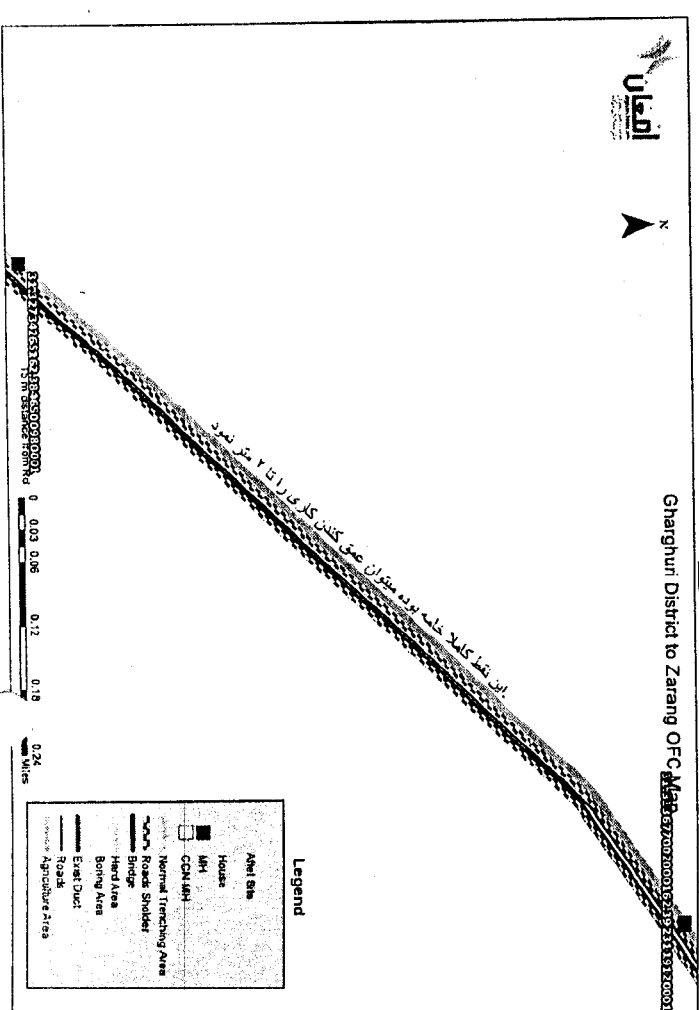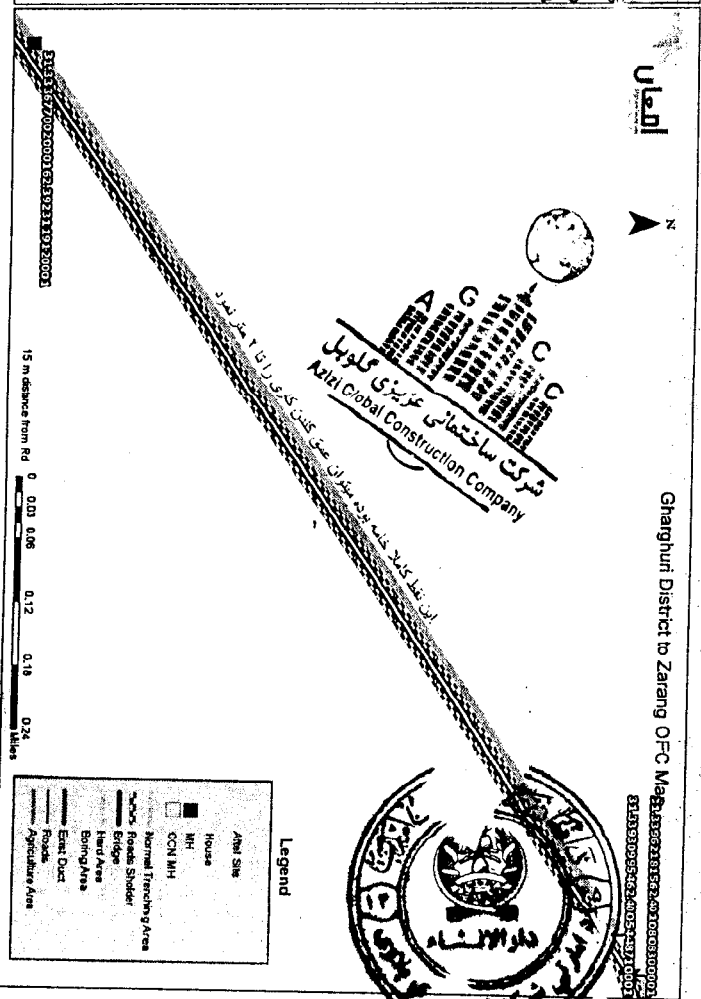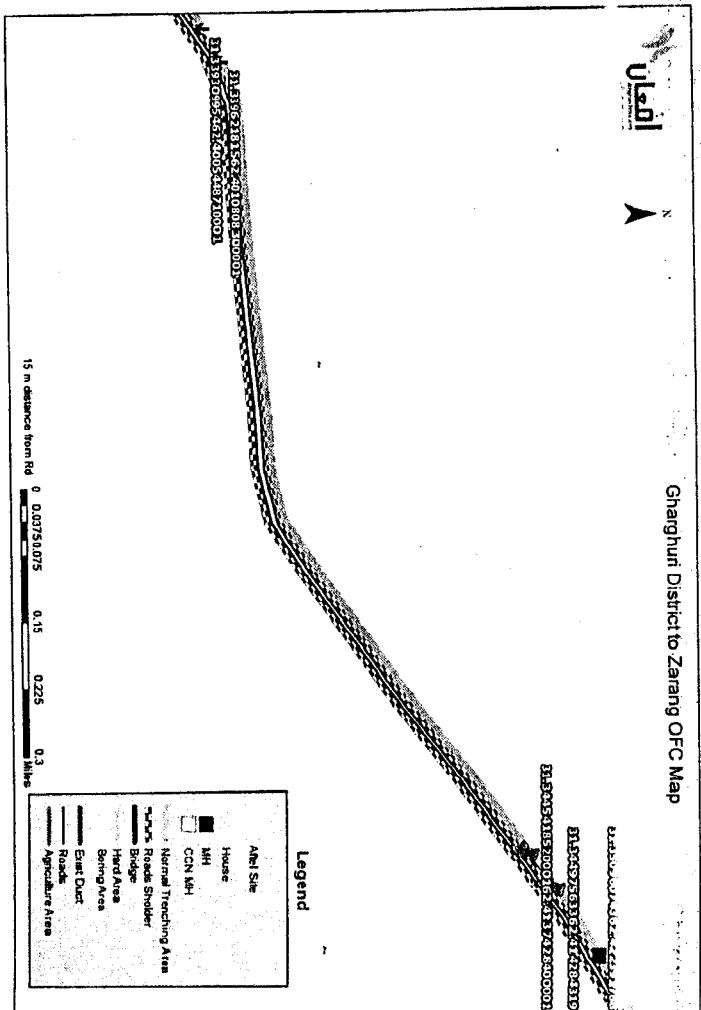

افغان

Gharghuri District to Zarang OFC Map

15 m distance from Rd 0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles

Legend

- Abut Site
- House
- MH
- CCM MH
- Normal Trenching Area
- Bridge
- Head Area
- Boring Area
- Exit Duct
- Roads
- Agriculture Area

این نقطه کاملاً خامه بوده میتوان عقب کردن کاری را تا ۲ متر نمود

شیرکت ساختمانی عزیز گل
Azizi Global Construction Company

دارالانشاء

افغان

Gharghuri District to Zarang OFC Map

15 m distance from Rd 0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles

Legend

- Abut Site
- House
- MH
- CCM MH
- Normal Trenching Area
- Bridge
- Head Area
- Boring Area
- Exit Duct
- Roads
- Agriculture Area

افغان

Gharghuri District to Zarang OFC Map

15 m distance from Rd 0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles

Legend

- Abut Site
- House
- MH
- CCM MH
- Normal Trenching Area
- Bridge
- Head Area
- Boring Area
- Exit Duct
- Roads
- Agriculture Area





افغان

Gharghuri District to Zarang OFC Map

15 m distance from Rd 0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles

Legend

- Abut Site
- House
- MH
- CCM MH
- Normal Trenching Area
- Bridge
- Head Area
- Boring Area
- Exit Duct
- Roads
- Agriculture Area

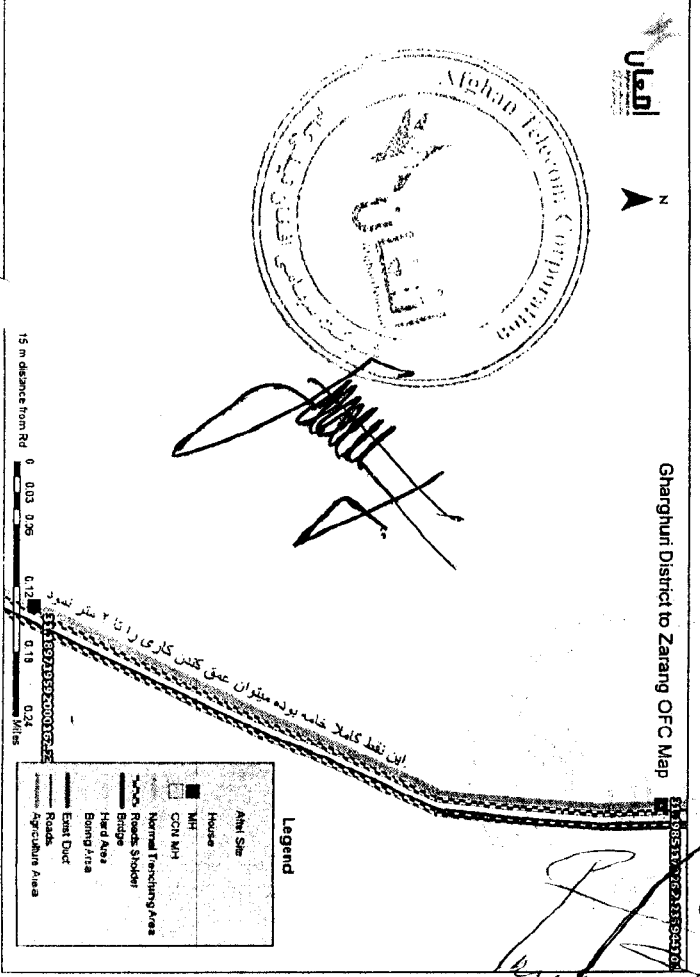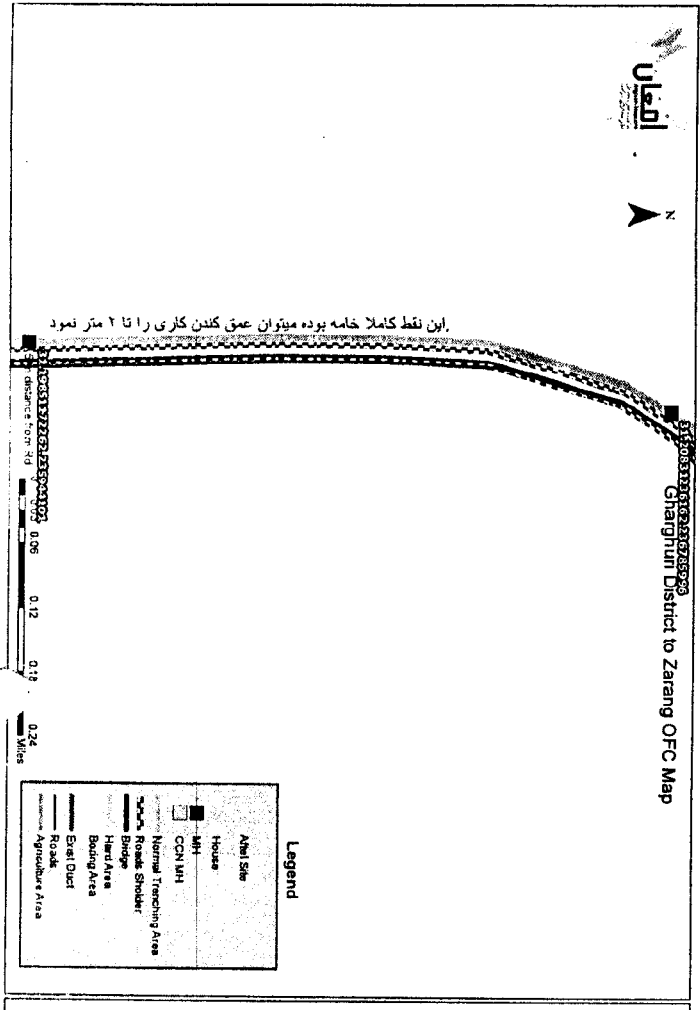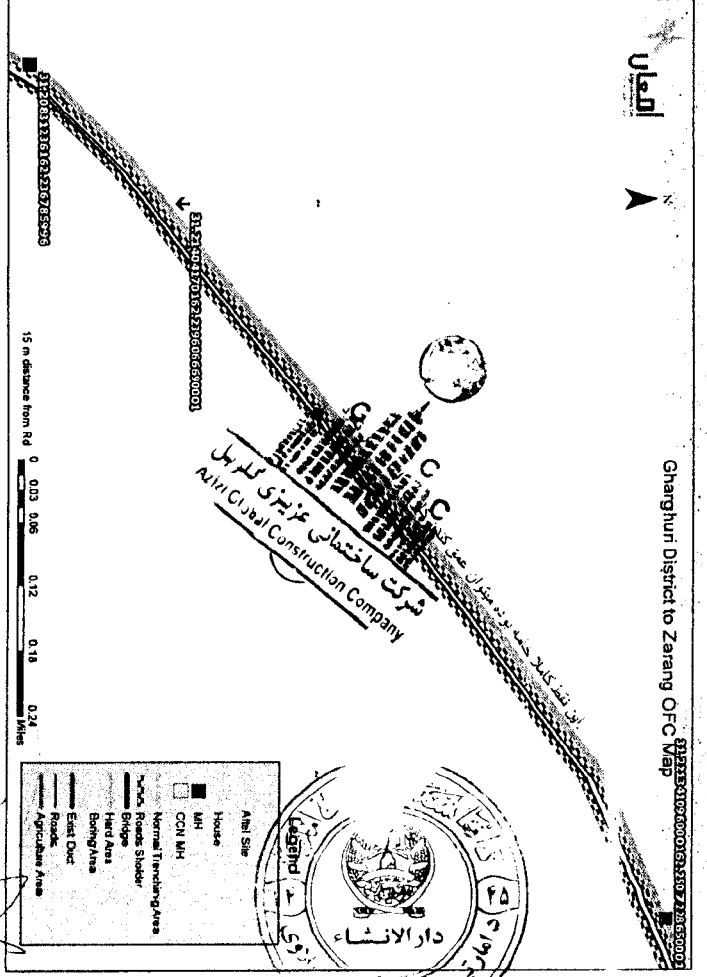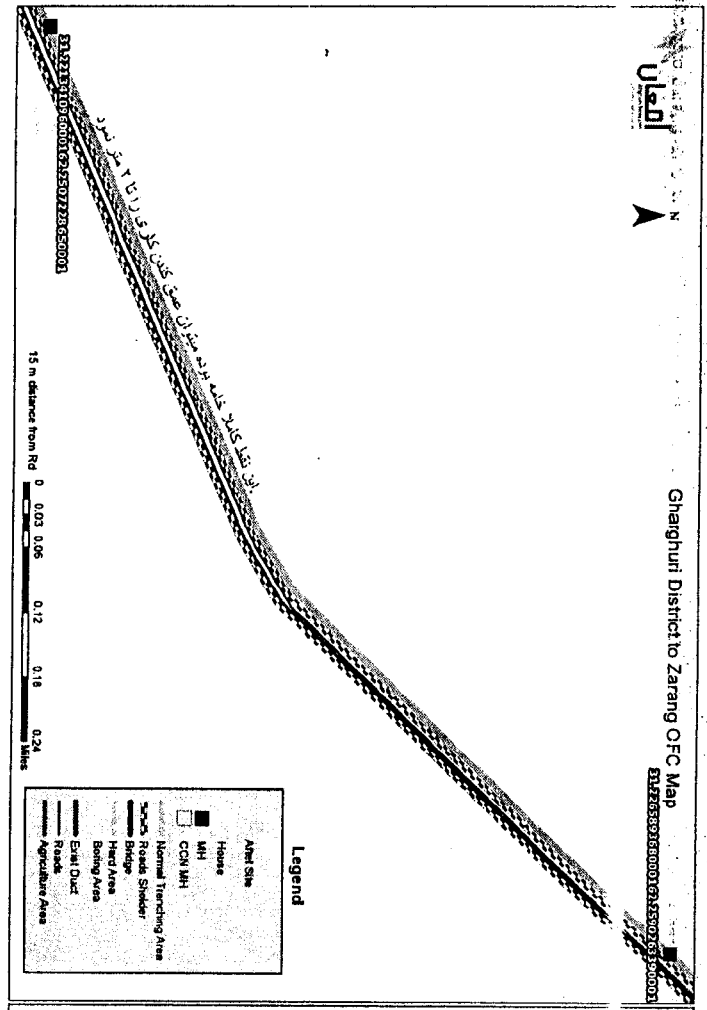

افغان

Gharghuri District to Zarang OFC Map

3147223381000162415282710001

این نقطه کاملاً خامه بوده میتوان عمق کندن کاری را تا ۲ متر نمود

15 m distance from Rd 0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles

Legend

Abul Site
House
MH
CCN MH
Normal Trenching Area
Service Roads Shoulder
Bridge
Hard Area
Soiling Area
Exist Duct
Roads
Agriculture Area

افغان

Gharghuri District to Zarang OFC Map

3147223381000162415282710001

شرکت ساختمانی غزنی کیلیان
Aziri Global Construction Company

15 m distance from Rd 0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles

Legend

Abul Site
House
MH
CCN MH
Normal Trenching Area
Service Roads Shoulder
Bridge
Hard Area
Soiling Area
Exist Duct
Roads
Agriculture Area

افغان

Gharghuri District to Zarang OFC Map

3147223381000162415282710001

این نقطه کاملاً خامه بوده میتوان عمق کندن کاری را تا ۲ متر نمود

15 m distance from Rd 0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles


Legend

Abul Site
House
MH
CCN MH
Normal Trenching Area
Service Roads Shoulder
Bridge
Hard Area
Soiling Area
Exist Duct
Roads
Agriculture Area

افغان

Gharghuri District to Zarang OFC Map





3147223381000162415282710001







15 m distance from Rd 0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles

Legend


Abul Site
House
MH
CCN MH
Normal Trenching Area
Service Roads Shoulder
Bridge
Hard Area
Soiling Area
Exist Duct
Roads
Agriculture Area

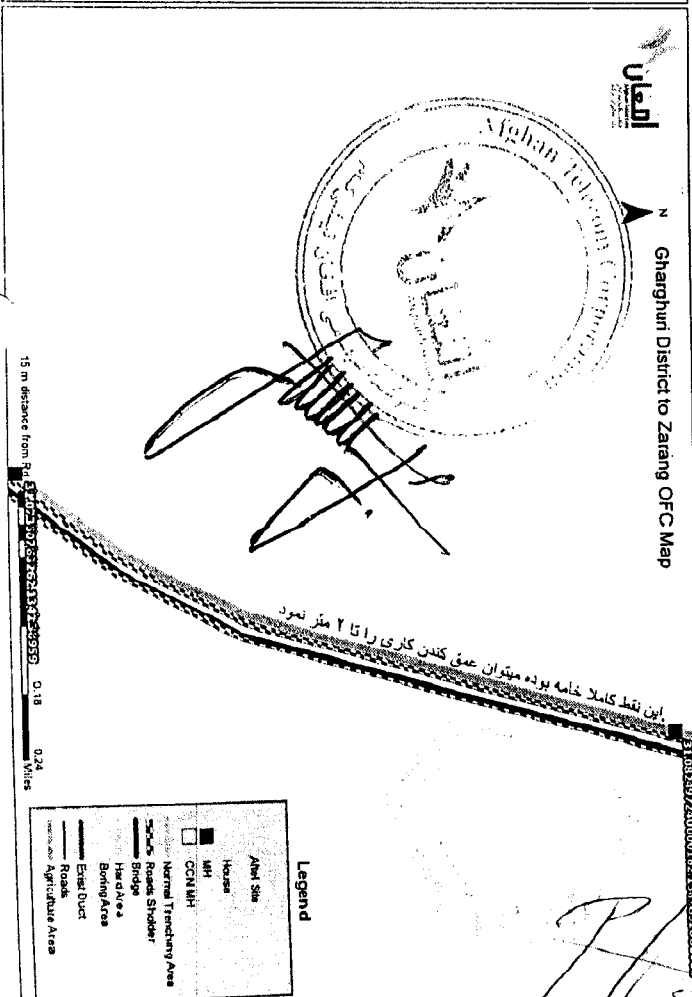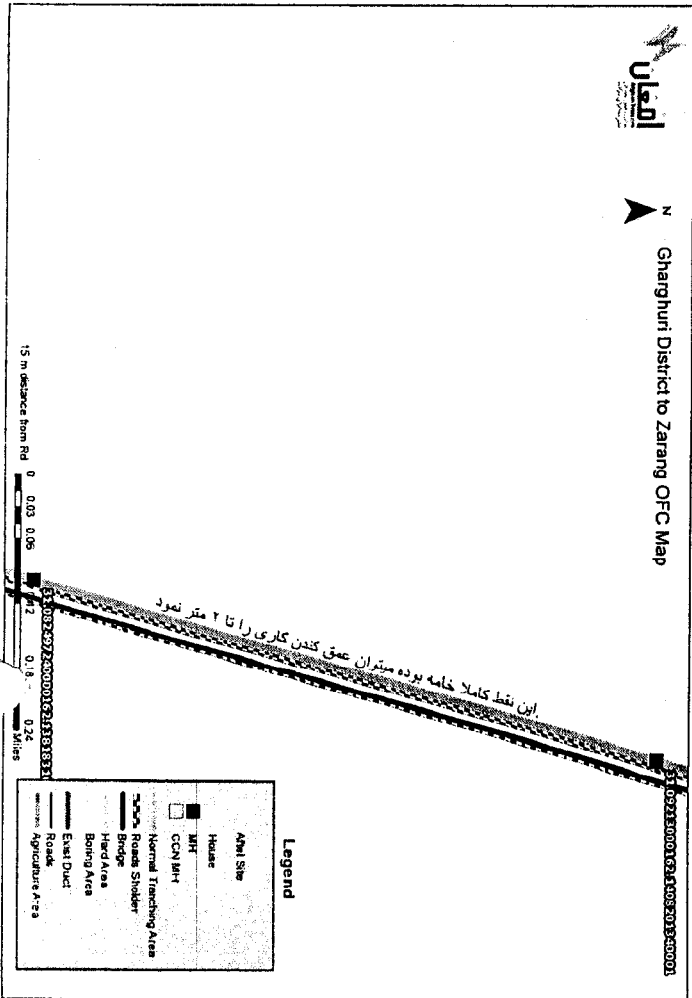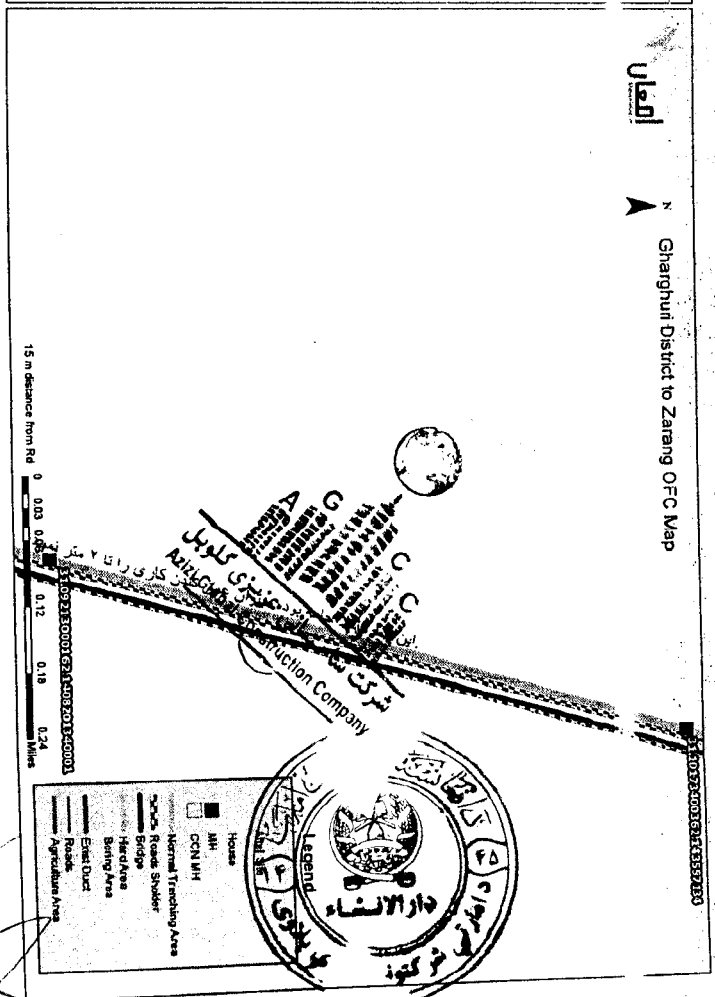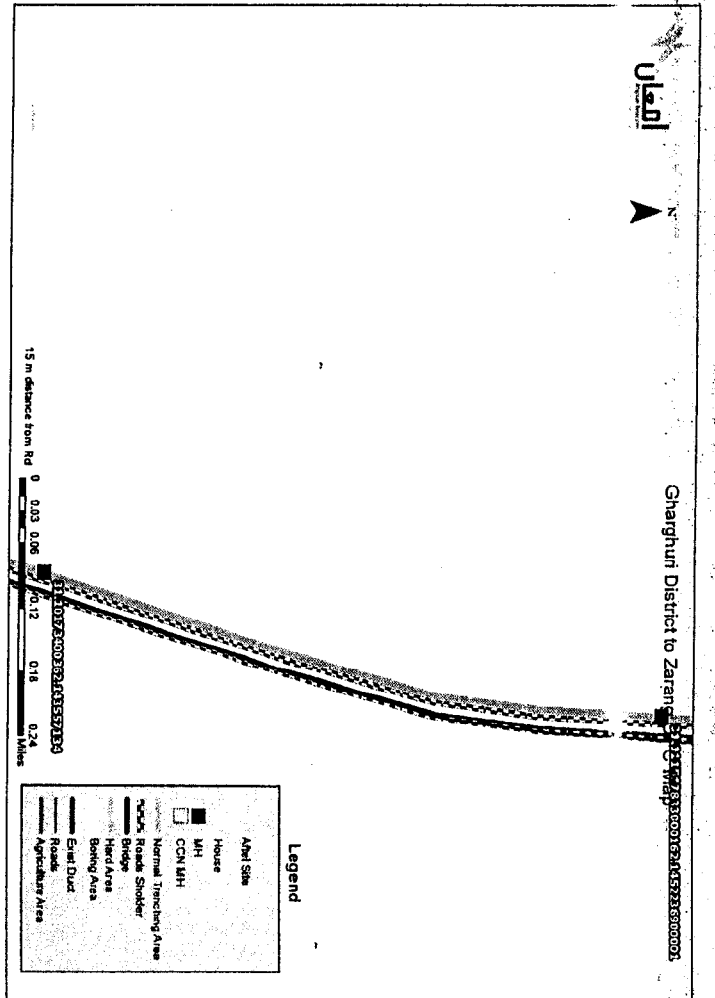

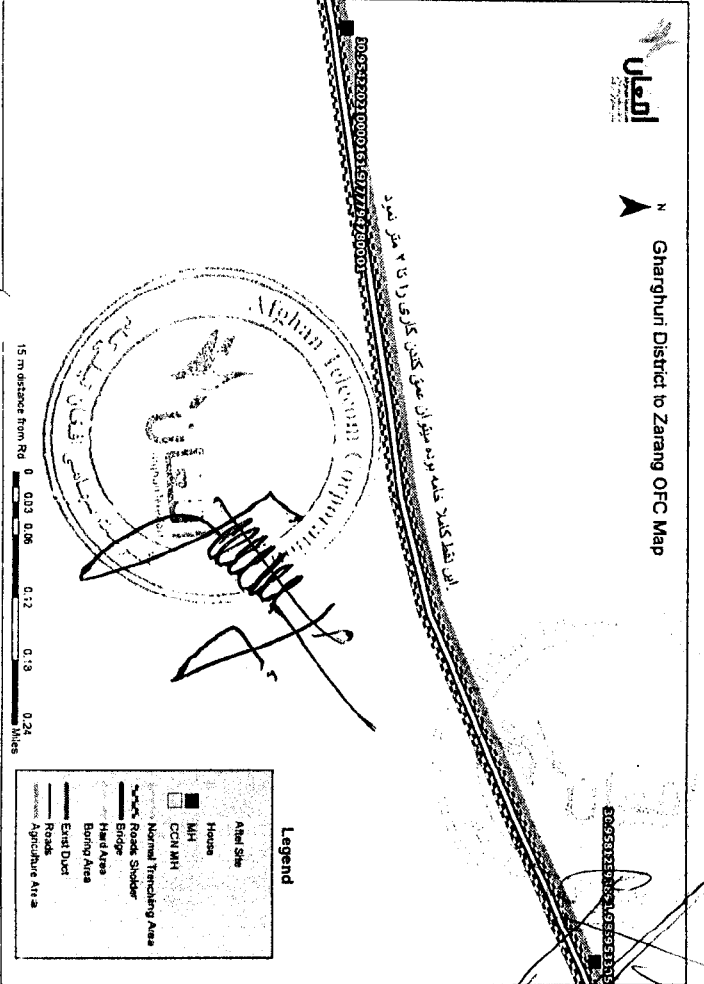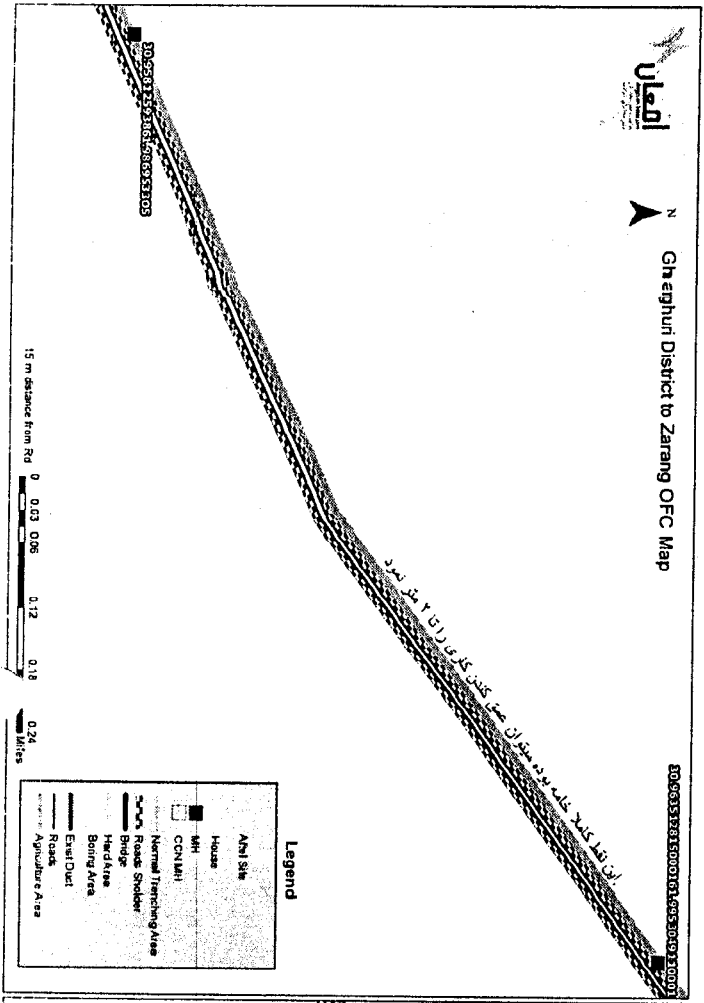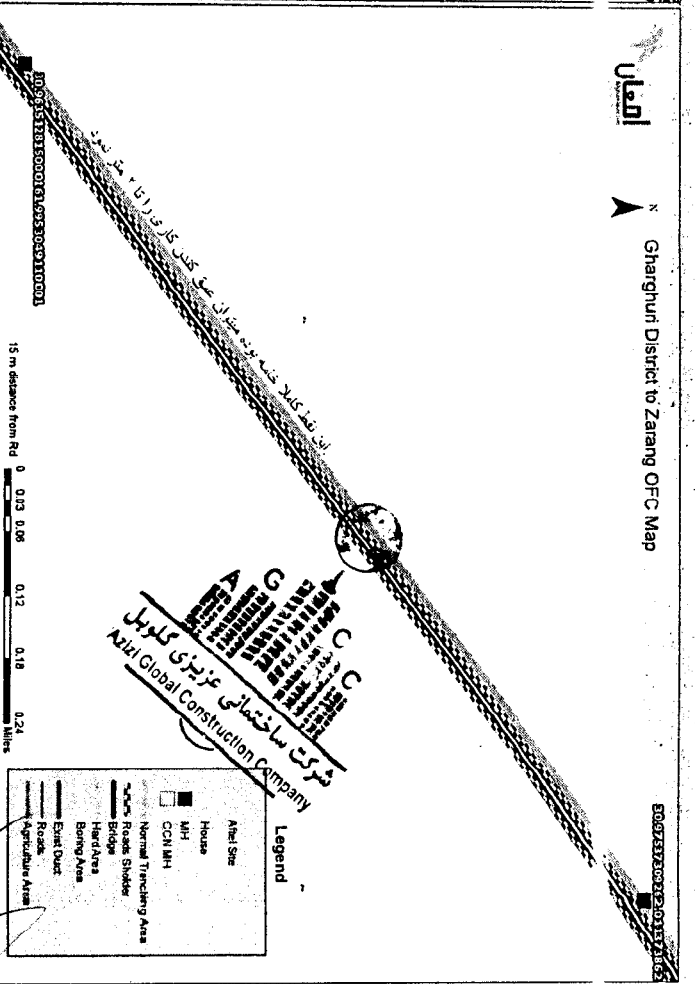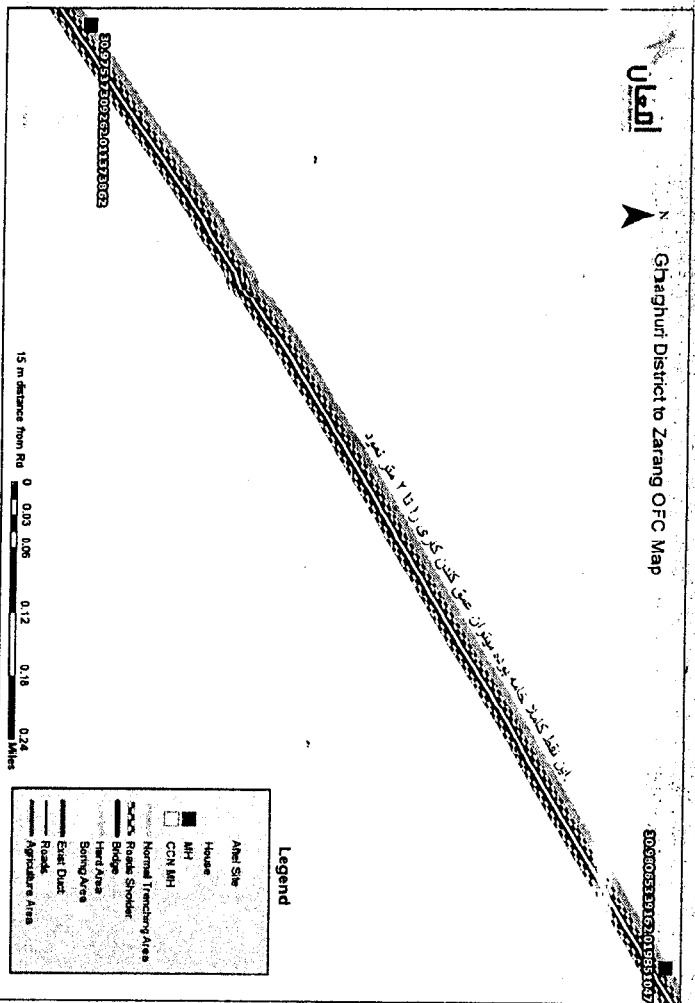


المان

Chaghuri District to Zarang OFC Map

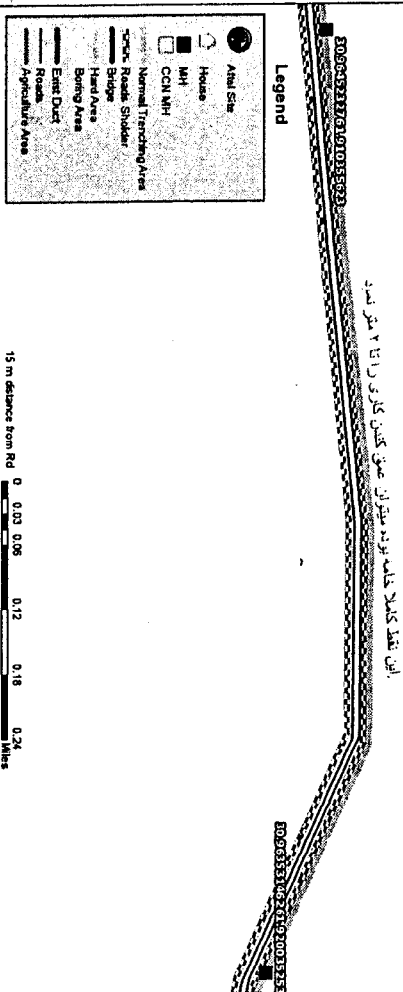


المان

Chaghuri District to Zarang OFC Map

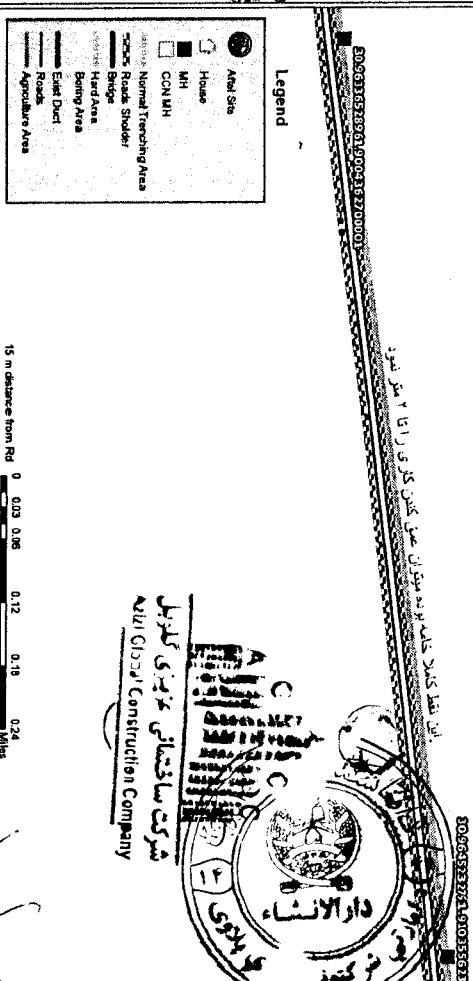

المان

Chaghuri District to Zarang OFC Map

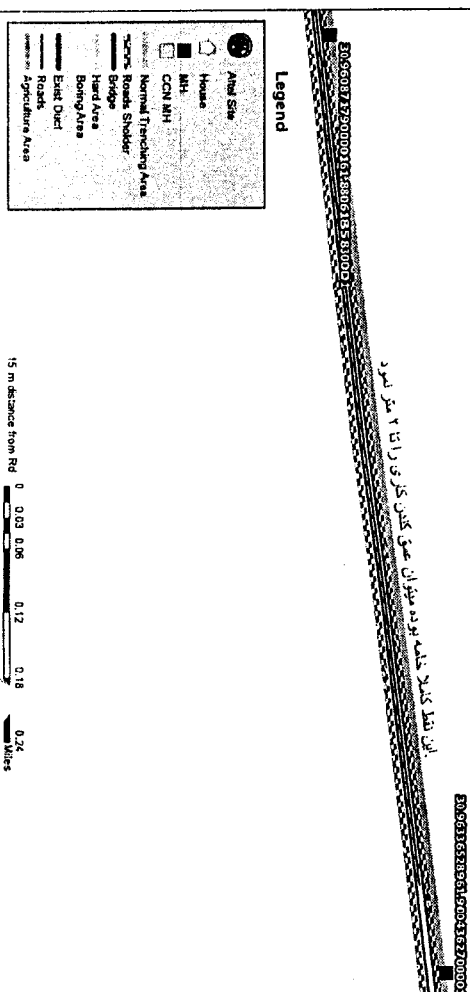

المان

Chaghuri District to Zarang OFC Map

