



امارات اسلامی افغانستان
هینت رهبری شرکت های امارتی



Islamic Emirate of Afghanistan
Afghan Telecom Corporation



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو رهبری پلاوی

د افغان تېلي کام مخابراتي شرکت لوی ریاست
مالي او اداري معاونیت
تدارکاتو ریاست
تړونونو آمریت
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درجه اهمیت

- ☐ محرم:
- ☐ عاجل:
- ☐ عادی:

شمبره: **SS2/448**

نېټه: ۱۴۴۵/۱۱/۱۲

موضوع: د (MCIT-AFTEL/1402/W-017/NCB) (MCIT-AFTEL/1402/W-018/NCB) پروژو لاسلیک شوي تړونونو د استولو

مزي لرونکي محترم عملياتي معاونیت!

السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ

د نېکو هیلو په وړاندې کولو سره

لکه څرنگه چې تاسو ته بهرته معلومه ده تاسو نیازمندي پر بنسټ د امارتي شرکتونو رهبري پلاوی سره د هرات، بادغیس ولایت نه تر فاریاب پوري کندنکاري او پایپ غځوني دریم، پنځم او نیمروز ولایت نه تر دلارام ولسوالي پوري کندنکاري او پایپ غځوني اول، دوهم او دریم لایونو تړونونه لاسلیک شوي، چې د همدې مکتوب سره مل د پروژو اړوند ذکرشوي یو نقل اصل لاسلیک شوي تړونونه د کار د پیل او تطبیق پر موخه در و استول شول، نوستاسو محترم معاونیت څخه په خورا درنښت هیله کيږي ترڅو چې په خپل سهم کې لازم اجرات ترسره کړي.

والسلام

مولوي محمد رحيم نديم
افغان تېلي کام مخابراتي شرکت مالي او اداري معاون

اباسر ز شمس افغاني سيکاره
محمود شتواي حوزا اجرات
عمود کاکړه

اکريټ OFC
د رابط وطن شمس افغاني سيکاره
نام، اصول و سمون نه ش
M. A. B.

د اداري مخبر
مدرس شمس افغاني سيکاره
د اداري مخبر

8475
1445-11-13

16887



امارت اسلامي افغانستان
هيئت رهبري شرکت های امارتي
شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

قرارداد بالمقطع


برای

پروژه کندنکاری و پایپ اندازی مسیر ولایت نیمروز الی ولسوالي دلارام برای لاپ دوم

آدرس اداره: محمد جان خان وات تعمیر پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

شماره داوطلبی: MCIT-AFTEL/1402/W-0 18/NCB

لات: دوم



موافقتنامه قرارداد

قرارداد کنندکاری، پایپ و کیبل اندازی مسیر نیمروز الی ولسوالی دلارام برای لاپ دوم این موافقتنامه به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۵ هـ.ش که برابر است به ۱۴۴۵/۱۰/۱۵ هـ.ق. میان شرکت مخابراتی افغان تیلی کام و شرکت ساختمانی نصیر نوید فیضی ثبت شده، تحت قوانین ا.ا. تحت جواز شماره 70529 صادره ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری، وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان بوده و آدرس دهن باغ کابل - افغانستان، مرکز می باشد عقد گردیده است. این قرارداد به مدت (۷) هفت ماه مدار اعتبار می باشد.

طوریکه اداره مطابق اعلان تدارکات کنندکاری، پایپ و کیبل اندازی مسیر نیمروز، الی ولسوالی دلارام تحت سه لاپ مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام تحت شماره داوطلبی MCIT-AFTEL/1402/W-018/NCB آفر داوطلب برنده (شرکت ساختمانی نصیر نوید فیضی) را برای کنندکاری، پایپ و کیبل اندازی مسیر نیمروز، الی ولسوالی دلارام برای لاپ دوم، به قیمت مجموعی (36,949,050) سی و شش میلیون و نو صد و چهل و نو هزار و پنجاه افغانی می باشد که منبع بنام «قیمت قرارداد» یاد می شود، قبول نموده است.

این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق می نماید:

1. در این موافقتنامه، کلمات و اصطلاحات همان معنی را افاده می نمایند که در شرایط قرارداد برای آنها در نظر گرفته شده است.
2. اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر کی از آنها منحنی بخشی از قرارداد استنباط میگردد:
 - 1.2 موافقتنامه
 - 2.2 شرایط عمومی قرارداد
 - 3.2 شرایط خاص قرارداد
 - 4.2 نیازمندیهای تخنیکی (به شمول جدول نیازمندی ها و مشخصات تخنیکی)
 - 5.2 آفر اکمال کننده و جدول قیمت
3. این قرارداد بالای سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.
4. در مقابل پرداخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را تهیه و هر نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصلاح نماید.
5. اداره تعهد می نماید که قیمت قرارداد و یا سایر مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد پردازد.



بدینوسیله جانبین تصدیق مینماید که این موافقتنامه در مطابقت با قوانین امارت اسلامی افغانستان بوده و سر از تاریخ فوق الی تاریخ / / ۱۴۴۵ قابل اعتبار می باشد.

از طرف و به نمایندگی از اکمال کننده:

نصیر احمد فیضی

رئیس شرکت ساختمانی نصیر احمد فیضی

امضاء

دهن باغ کابل - افغانستان

شماره تماس: ۰۷۴۵۴۰۰۲۰۰

به نمایندگی اداره:

مولوی احمد جان بلال

رئیس هیئت مدیره شرکت های امارتی

امضاء ۱۱/۱۱/۱۴۴۵

منزل چهارم، تعمیرات و پارسل، وزارت مخابرات و مخابراتی، مکتب

جان شماره تماس: +93 (0) 20 210 44 40



Handwritten signature in black ink.

شرایط عمومی قرارداد

الف: عمومیات

ماده 1- تعریفات

1- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:


- 1- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند.
- 2- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده 44 شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.
- 3- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند 1 ماده 55 شرایط عمومی قرارداد.
- 4- قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند 2 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد می باشد.
- 5- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.
- 6- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.
- 7- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیلات بعدی وارده مطابق قرارداد می باشد.
- 8- روز: روز تقویمی می باشند.
- 9- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیصدی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد.
- 10- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.
- 11- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد.
- 12- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند 1 ماده 35 شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.
- 13- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد.
- 14- اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.
- 15- تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگردد.



[Handwritten signature]




- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ.

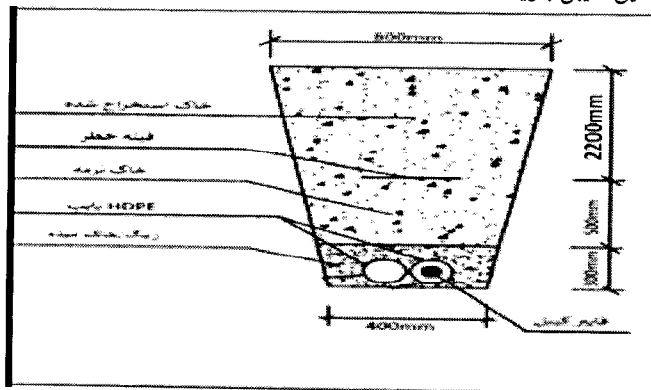

5.4 روش کندنکاری ساحات بورنیگ:

- کندن کاری به عمق (200 cm)؛
- بور نمودن ساحات به قطر $6 \text{ inch} \pm 20\%$ طور افقی؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزه های نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غریبل شده) به ضخامت (10cm)؛
- پایپ اندازی دو جوره (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غریبل شده) به ضخامت (20cm) بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت (50cm)؛
- فرش فیلته خطر بعد از (70cm) پرکاری؛
- پرکاری مکمل ساحه کندنکاری شده، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ؛
- در مسیر سرک و تپه ها ضرورت بور دارد، نیاز به ماشین HDD است.

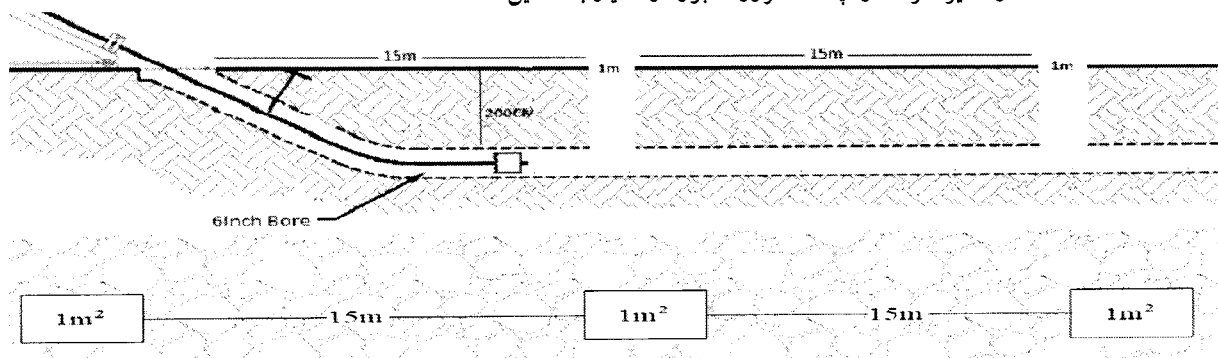

5.5 اعمار هندحول:



- کندن کاری برای اعمار هندحول به اندازه ذیل:



Handwritten signature.



- عمق 240 سانتی متر؛
- عرض 190 سانتی متر؛
- طول 190 سانتی متر.
- اعمار نمودن هندحول با ابعاد ذیل مطابق مشخصات درج شده شکل شماره 4:
- عمق 180 سانتی متر؛
- عرض 120 سانتی متر؛
- طول 120 سانتی متر.
- کانکریت:
- یک قسمت سیمنت؛
- دو قسمت ریگ ماسه؛
- یک قسمت جغل (کرش بادامی)؛
- تهیه سقف هندحول هم سطح زمین / پیاده رو؛
- درج نقاط GPS هندحول در جدول؛
- تمديد پایپ (HDPE) از وسط دیوار هندحول طبق نقشه شماره 4؛
- تمام GPS point هندحول ها درج جدول؛
- تهیه ونصب سرپوش چودنی قفل دار به وزن 100 کیلوگرام، چپ راست دار معه ماستر کلید؛
- نصب براکت و فوم نمودن سرپایپ در هندحول و فایبر گلاس.

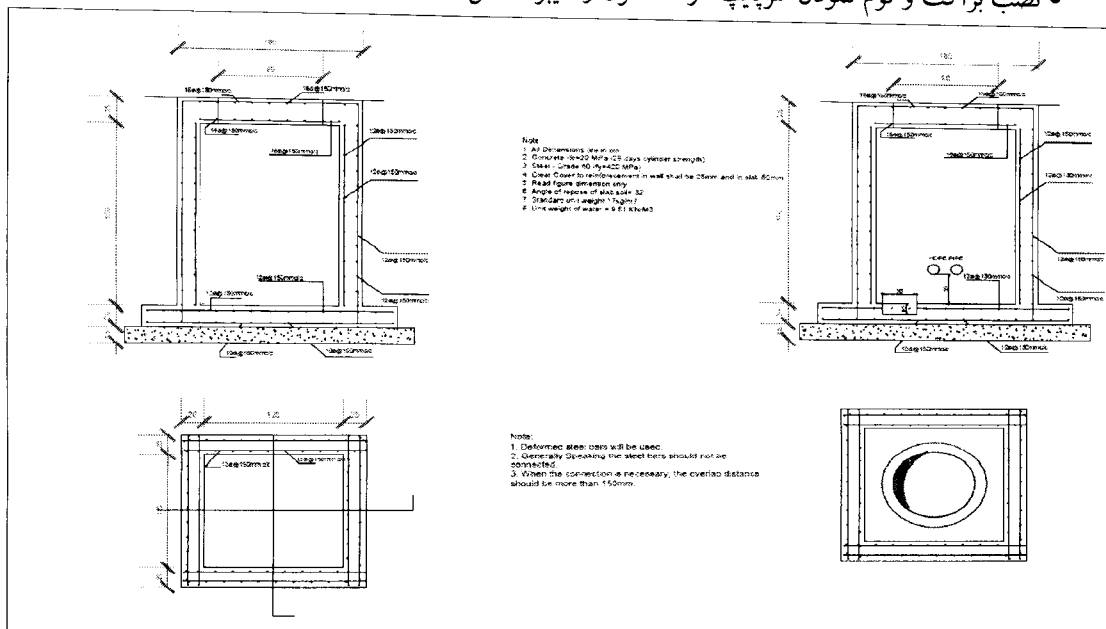


[Handwritten signature]





5.6 نصب نمودن فایبر گلاس:

- کندن کاری به ابعاد اندازه فایبر گلاس و مطابق عمق کندنکاری (200cm)؛
- وصل نمودن پایپ با فایبر گلاس؛
- فوم نمودن سرپایپ در فایبر گلاس و نصب نمودن ID Ball؛
- کیبل اندازی پر کردن داخل فایبر گلاس توسط ریگ میده یا خاک غریبل شده؛
- دو لایه چیدن خشت مطابق شکل 7؛
- پرکاری و ترمیم دوباره ساحات تخریب شده به حالت اولی ان؛
- تمام GPS point فایبر گلاس ها با دقت ان در حدود ۱۰ سانتی متر درج جدول.

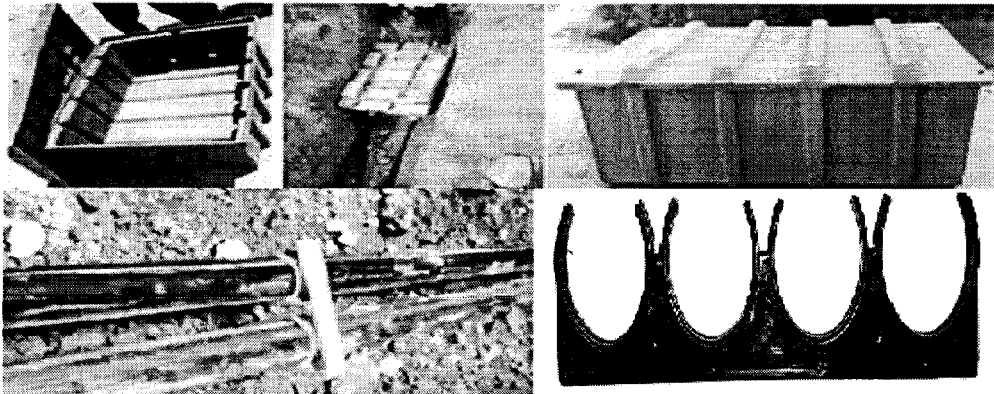

5.7 نصب پایپ اهنی در پل:

- پایپ اهنی چهار انچ مطابق شکل 8 نصب گردد و کلیپ نمودن ان در هر یک متر؛
- ضخامت $3\text{mm} \pm 10\%$ باشد.

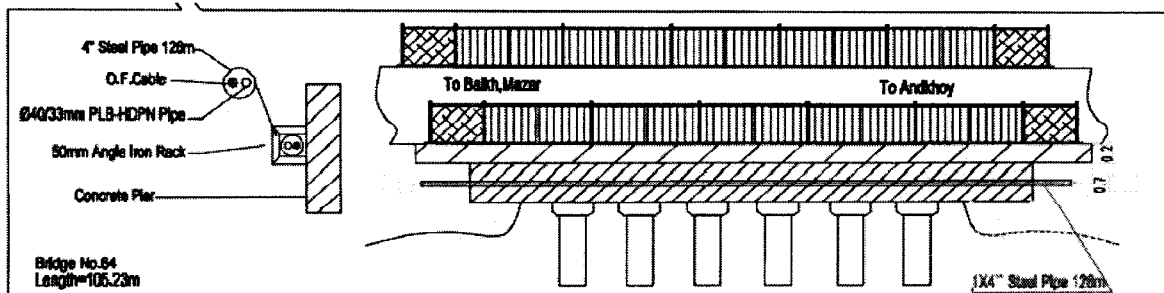


Handwritten signature



5.8 روش کندنکاری ساحات تپه های کوهی و بورینگ ان:

- بور نمودن ساحات تپه های خاکی توسط ماشین HDD؛
- بور نمودن ساحات به قطر $6 \text{ inch} \pm 20\%$ طور افقی؛
- پایپ اندازی دو جوهره (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ؛
- بور نمودن ساحه توسط ماشین با عمق 15 الی 20 متر و طول ان از 50 الی 200 متر.






5.9 تهیه نمودن پایپ محافظی :

(HDPE) Duct with Tracer Wire

- The HDPE Duct shall be suitable for cable laying by blowing / pulling technique;
- Appropriate non-metallic couplers (connecting sockets) will be used to join two pieces of HDPE ducts for a locked and air sealed assembly;
- HDPE drum should be 2km;
- HDPE pipes shall meet the international standards and satisfy the following technical specification
- 100% Polyethylene raw materials;
- black color;
- Double layer pipe;
- The nature material of the; outer layer shall be polyethylene pipe;
- The thickness of the outer layer shall be 2.5mm;
- The thickness of the inner layer shall be 1.2mm;
- The color of the inner layer of the pipe should be white;
- The thickness of both layers should be 3.7mm;
- The inner should be Silicone material and diameter of the pipe should be 36.3 mm;
- The outer diameter of the pipe should be 40 mm;
- The weight per meter should be 430 grams;
- The pressure tolerance should be 16 bar or better;
- The length of each pipe should be 2 km, pieces is not acceptable in the drum;
- On the outer layer of pipe, name of Afghan Telecom and length (Meter) should be mentioned.
- HDPE Duct with Tracer Wire is a revolutionary HDPE Duct with built-in detect-ability;
- Detector wire should be 100% pure copper with 1mm diameter;
- Tracer Wire carries a co-extruded HDPE encased copper wire, which acts as a corrosion proof conductor and provides complete detect-ability in use with multiple frequency locator.

5.10 تهیه پایپ محافظی (HDPE) Duct

- The HDPE Duct shall be suitable for cable laying by blowing / pulling technique;
- Appropriate non-metallic couplers (connecting sockets) will be used to join two pieces of HDPE ducts for a locked and air sealed assembly;
- HDPE drum should be 2km;

- HDPE pipes shall meet the international standards and satisfy the following technical specification
- 100 % Polyethylene raw materials;
- black color;
- Double layer pipe;
- The nature material of the; outer layer shall be polyethylene pipe;
- The thickness of the outer layer shall be 2.5mm;
- The thickness of the inner layer shall be 1.2mm;
- The color of the inner layer of the pipe should be white;
- The thickness of both layers should be 3.7mm;
- The inner should be Silicone material and diameter of the pipe should be 36.3 mm;
- The outer diameter of the pipe should be 40 mm;
- The weight per meter should be 430 grams;
- The pressure tolerance should be 16 bar or better;
- The length of each pipe should be 2 km, pieces is not acceptable in the drum;
- On the outer layer of pipe, name of Afghan Telecom and length (Meter) should be mentioned.

5.11 تهیه نمودن هندحول HDPE یا فایبر گلاس:

- Dimension: 1030*520*360 (mm) $\pm 10\%$;
- Weight: 32 kg;
- Resist pulling intensity: 313 MPa;
- Resist band intensity: 235 MPa;
- Resist Pressure Intensity: 245 MPa;
- In the event that the supplier notices discrepancies above and would want update according to their specific equipment/material configuration shall notify Afghan Telecom.

5.12 تهیه نمودن Electrical Telecom ID Ball

- Marker Depth: 1.5-2m;
- Utility Type: Telephone;
- Marker Function: Passive.

5.13 تهیه نمودن Plastic Spacer

- Material – Polyethylene Size Suitable Plastic Spacer Four Way.



6. مسولیت های فرمایش دهنده و فرمایش گیرنده:

شماره	مسولیت ها	فرمایش دهنده	فرمایش گیرنده
کار ساختمانی:			
1	تعیین و مشخص نمودن ساحه و مسیر برای کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی؛	√	
2	اجازه بمنظور تطبیق نیازمندی/ پروژها در ساحات مورد نیاز از اورگانهای دولتی و حل معضلات با نهادها زیر ربط (امنیتی، فواید عامه)؛	√	
3	تهیه کتاب ژورنال به منظور معلومات روزمره از پیشرفت و نواقص کار؛	√	
4	اندازه گیری ساحات تطبیق شده؛	√	
5	وصل و جابجایی کیبل فایبر نوری؛	√	
6	وصل و نصب ODF در سایت ها؛	√	
7	تهیه و تسلیم نمودن اجناس (پیپ HDPE، فایبر گلاس یا هندحول HDPE، کیبل فایبر نوری، ای دی بال، Pipe Spacer و فیته خطر) به قراردادی؛	√	
8	چک و امتحان کیبل توسط ماشین OTDR و ارایه گزارش از هر فایبر (Cores)؛	√	
9	نصب نمودن HDPE pipe spacers در هر 40m به شکل معیاری،		√
10	انتقال اجناس مورد نیاز (پیپ HDPE، فایبر گلاس یا هندحول HDPE، کیبل فایبر نوری، ای دی بال، Pipe Spacer و فیته خطر) از گدام شرکت مخابراتی افغان تلکام مربوط زون بادغیس الی ساحه کار؛		√
11	تعیین و معرفی نماینده قراردادی منحصیث ناظر با صلاحیت جهت نظارت از پیشرفت کار و حل مشکلات؛		√
12	ارایه گزارش از پیشرفت کار به طور روزانه و هفته وار به کار فرما (شرکت افغان تلکام)		√
13	تهیه نقشه نهایی (As Build Drawing of GIS or Auto CAD) با موقعیت GPS فایبر گلاس و هندحول؛		√
14	تامین امنیت کارمندان و کارگران به منظور تطبیق پروژها؛		√
15	کیبل باید توسط ماشین کامپریسور با استفاده از درم جگ تمدید گردد و بدون ماشین کامپریسور قابل قبول نمیشد (قراردادی میتواند از ماشین شرکت افغان تلکام به طور امانت استفاده و بعد از ختم کار به شرکت افغان تلکام تسلیم نماید، در صورت ماشین کامپریسور افغان تلکام مشکل تخنیکی داشته باشد شرکت قراردادی میتواند مشکل را رفع نموده و از ان استفاده نماید)؛		√
16	جلو گیری از گره خوردن (bend radius) کیبل فایبر نوری و تمدید ان به طور دقیق و مسلکی؛		√
17	چک و امتحان پایپ ها و (HDPE) Duct Tracer Wire در حضور داشت نماینده شرکت افغان تلکام غرض جلوگیری از مسدود بودن ان؛		√
19	در جریان کار و مسیر تمدید کیبل فایبر نوری ملکیت های عام المنفعه متضرر نشود، طوریکه ارایه گردید تمام ساحات کندنکاری شده طبق مشخصات کندنکاری بعد پرکاری و ترمیم دوباره ساحات تخریب شده به حالت اولی ان برگردد؛		√
20	در صورت موجودیت موانع در مسیر تمدید کیبل فایبر نوری		√




		برداشتن موانع، هم سطح نمودن ساحه و آماده نمودن ان به کندنکاری، تمديد پايپ و کيبل اندازی؛	
✓		کندنکاری و تمديد کيبل به هدايت نمايده شرکت افغان تليکام بطور مستقيم با یک فاصله ثابت از سرک، در صورت مستقيم نمودن کندنکاری قراردادی مسئول است مطابق هدايت دوباره کندنکاری نمايد؛	21
✓		در مسير متذکره تپهای خاکی و سرک ها نیاز به بور دارد و بور ان توسط ماشين HDD(Horizontal Directional Drilling) انجام گردد؛	22
✓		در مسير عرض شلدر بسيار کم است از ماشينری (Trencher) پيشرفته استفاده و کندنکاری با عرض کمتر که باعث تخريب شلدر و جويچه نگرده؛	23
✓		در پروژه که عام المنفع (سرک، جوی، ساحه سبز، پل و ديگر) متضرر ميشود بايد پس همان طور اعمار و ترميم گردد.	24
اجناس:			
	✓	چک نمودن وسايل مطابق قرارداد و تهيه نمودن گزارش؛	1
✓		تهيه نمودن وسايل مطابق قرارداد؛	2
✓		انتقال وسايل در گدام شرکت افغان تليکام ولايت بادغيس؛	3
✓		پيش بردن پروسه مالياتی و گمرکی.	4
	✓	معاینه اجناس	5

نوت: قراردادی قبل ازافرگشایی باید ازساحه معلومات (نوعیت کندنکاری) و اطلاع دقیق داشته باشد جهت عدم تطبیق پروژه بعد از عقد قرارداد هیچ نوع معذرت پذیرفته نمیشود.

ساحه کاری و جدول تحویل دهی اجناس مورد ضرورت:

تاریخ ختم کار	تاریخ آغاز کار	محل و ساحه کار	مشخصات تخنیکی
بعد از عقد قرارداد و بعد از صدور مکتوب اجازه کار به مدت ۷ ماه	بعد از عقد قرارداد و بعد از صدور مکتوب اجازه کار	ساحه کار از 60 کیلو متری دوراهی دلارام الی 76 کیلومتر	لات دوم (لات دوم)



(Handwritten signature and official stamp)



میعاد قرارداد طور ذیل می باشد:

میعاد قرارداد به مدت 7 ماه تقویمی بعد از عقد قرارداد می باشد.

Project timeline for each section (lot)																							
ID	Route Name	Activity	Duration Week	Start Week	End Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	لنځونکې سړک ولسوالۍ کړخ الی	Administrative procedure	1	1	1																		
		Delivering equipment to work	1	2	3																		
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																		
		Cable blowing	1	15	16																		
		link test	1	17	18																		
		Review of work completion and report	1	19	20																		
		handover of project	1	21	22																		
2	زقده نو الی شروع کړل سړک	Administrative procedure	1	1	1																		
		Delivering equipment to work	1	2	3																		
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																		
		Cable blowing	1	15	16																		
		link test	1	17	18																		
		Review of work completion and report	1	19	20																		
		handover of project	1	21	22																		
3	ز شوه قلعه نو الی پل غلښه	Administrative procedure	1	1	1																		
		Delivering equipment to work	1	2	3																		
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																		
		Cable blowing	1	15	16																		
		link test	1	17	18																		
		Review of work completion and report	1	19	20																		
		handover of project	1	21	22																		
4	ز پل غلښه الی پل غلښه و نه کورسټری ان	Administrative procedure	1	1	1																		
		Delivering equipment to work	1	2	3																		
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																		
		Cable blowing	1	15	16																		
		link test	1	17	18																		
		Review of work completion and report	1	19	20																		
		handover of project	1	21	22																		
5	ز پل غلښه الی پل غلښه و نه کورسټری ان	Administrative procedure	1	1	1																		
		Delivering equipment to work	1	2	3																		
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																		
		Cable blowing	1	15	16																		
		link test	1	17	18																		
		Review of work completion and report	1	19	20																		
		handover of project	1	21	22																		

11. تفتیش بصری برای:

آزمایش و معاینه توسط هیئت معاینه طور ذیل صورت میگیرد:

تفتیش و معاینه بصری

تفتیش و معاینه فزیک

معاینه عملیاتی (در صورت ضرورت)

معاینه تخنیک

معاینه تخنیک در ولایت مربوطه ساحه کار مربوطه با حضورداشت نماینده طرفین ذیلاً صورت میگیرد:

- حصول اطمینان از برداشت بار (Load) پایپ و غیره زیر نظر فرمایش گیرنده از جانب فرمایش دهنده (شرکت مخابراتی افغان تیلی کام) صورت میگیرد.





و سایر معاینات در مطابقت به مشخصات داده شده در صورت که ایجاب کند، توسط هیئت معاینه صورت خواهند گرفت

نوت: همه تفتیش ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هیئت موظفان در موقع تحویل دهنی جنس صورت میگیرد



Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Communications and Information Technology of Afghanistan.





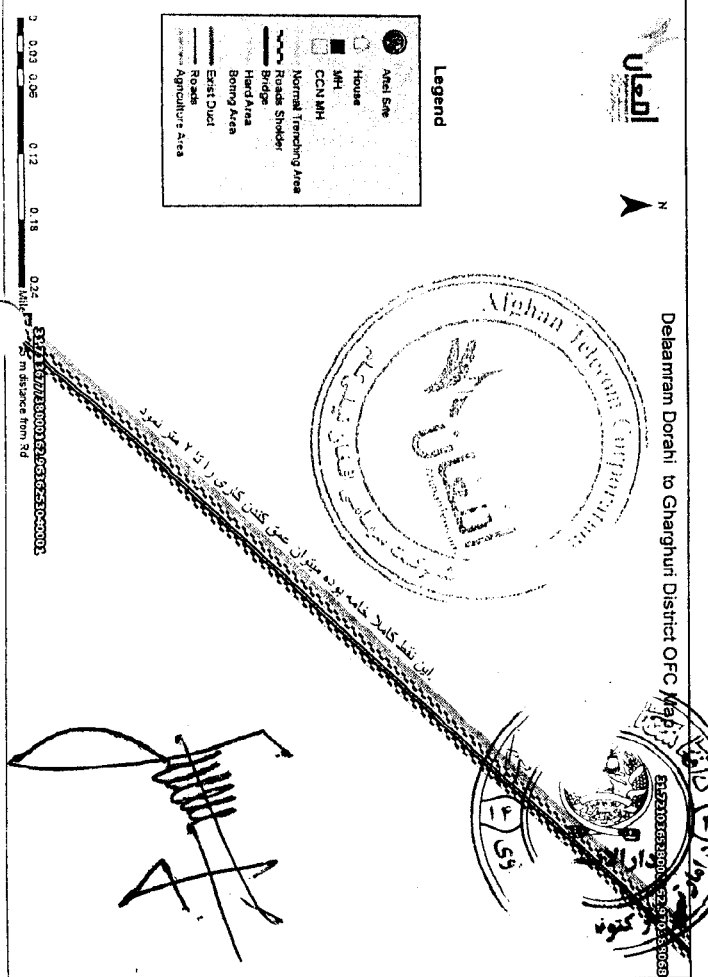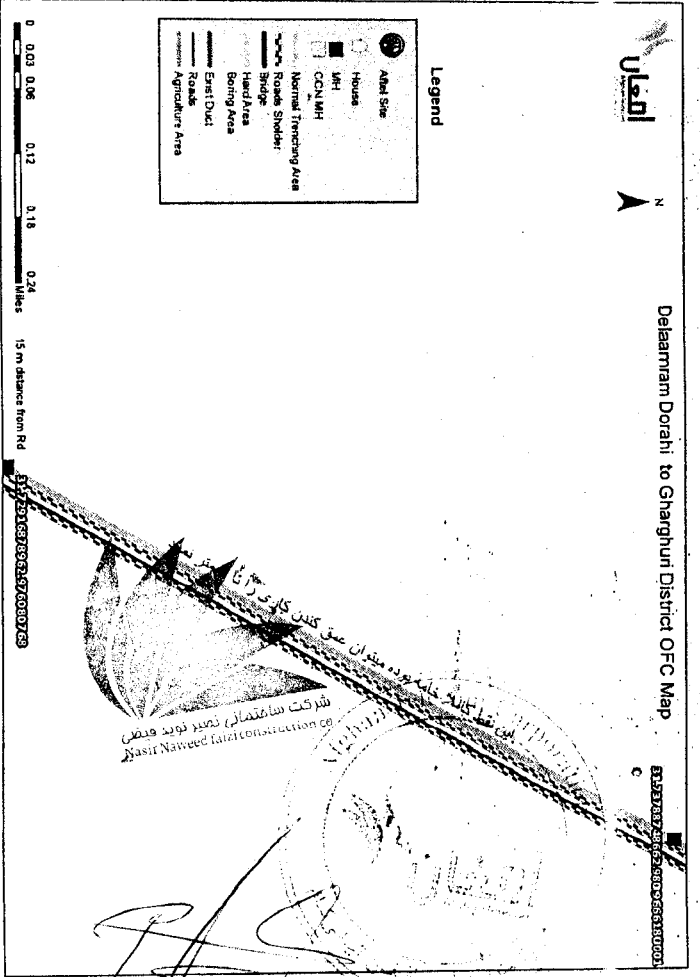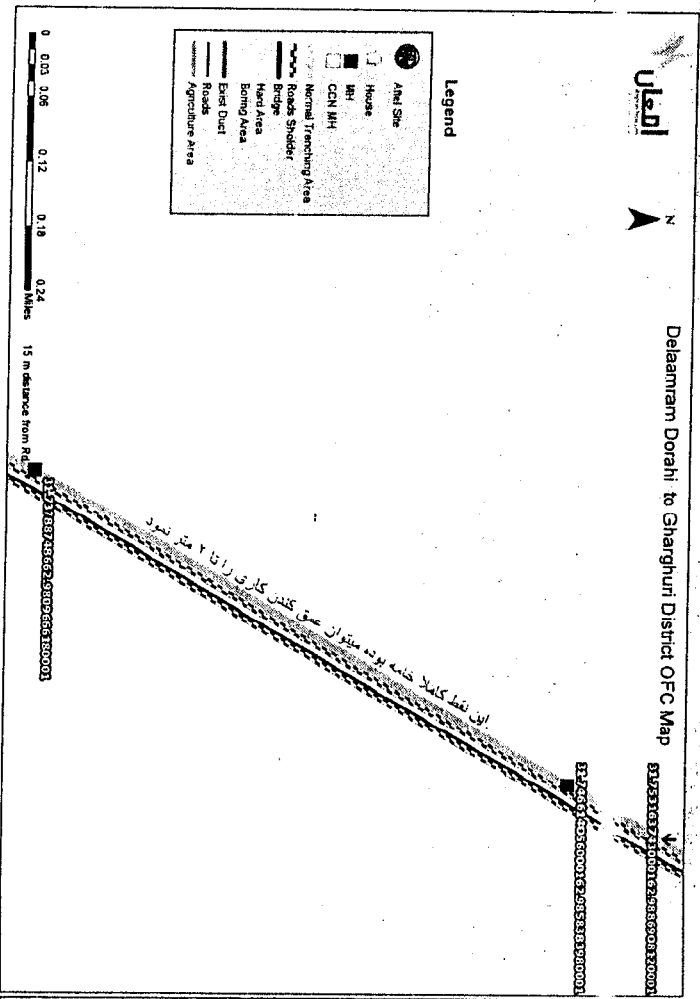

البحان

Dehnamram Dorahi to Gharghuri District OFC Map



Legend

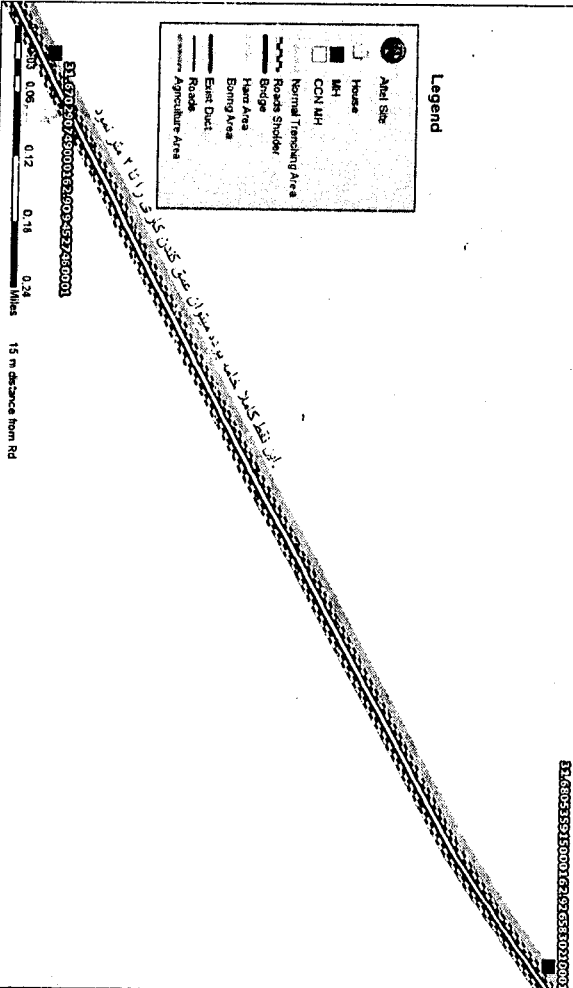

البحان

Dehnamram Dorahi to Gharghuri District OFC Map



Legend

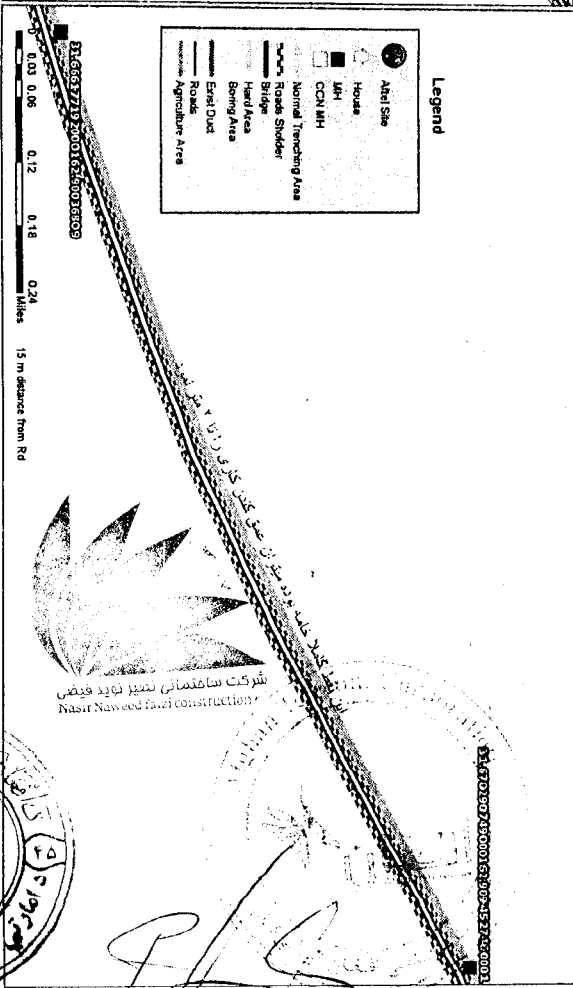

البحان

Dehnamram Dorahi to Gharghuri District OFC Map



Legend

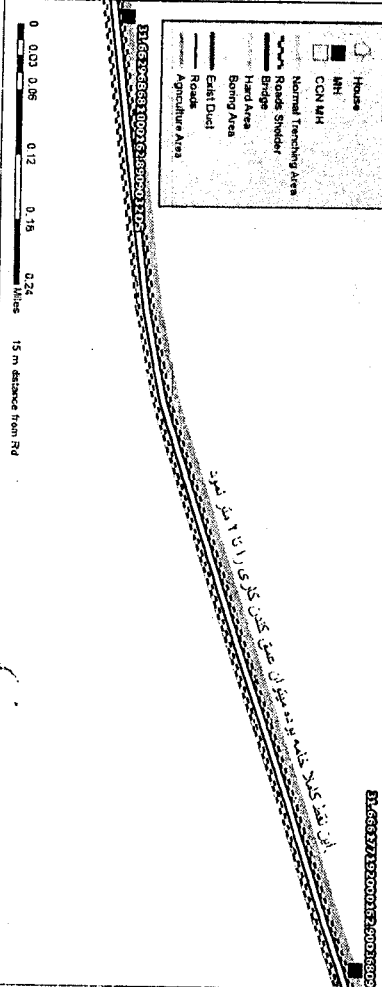

البحان


Dehnamram Dorahi to Gharghuri District OFC Map

Legend

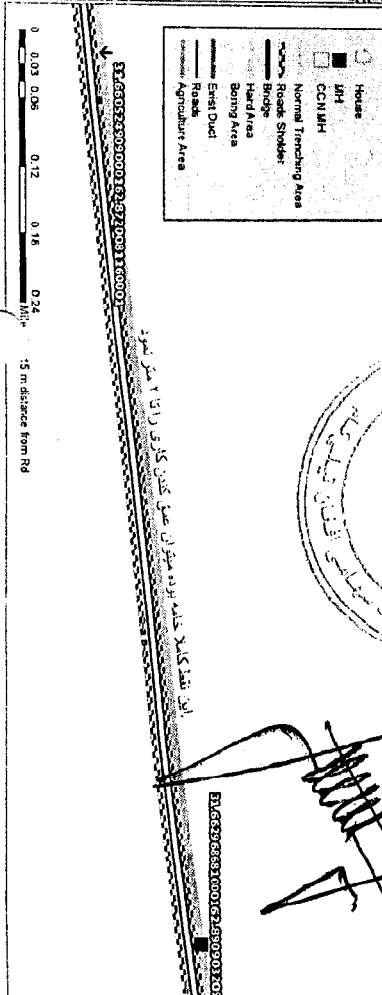


البحان

Delamram Dorahi to Gharghuri District OFC Map

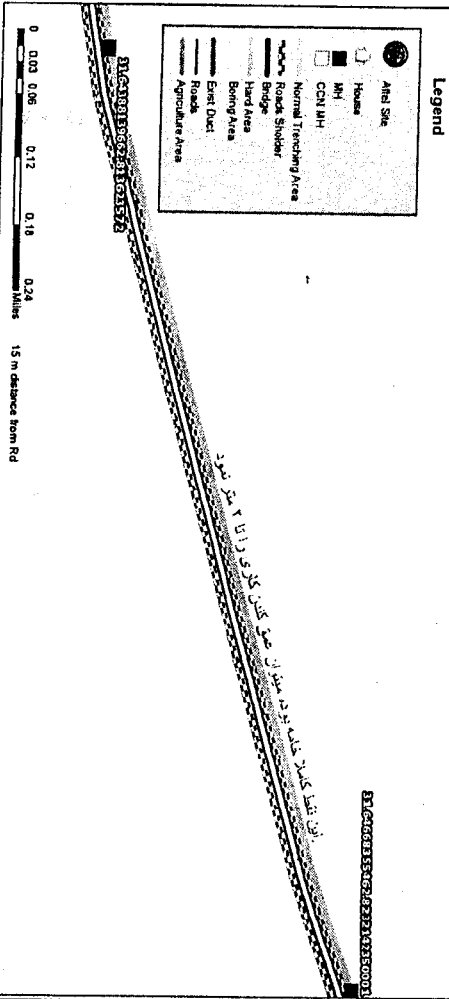


البحان

Delamram Dorahi to Gharghuri District OFC Map

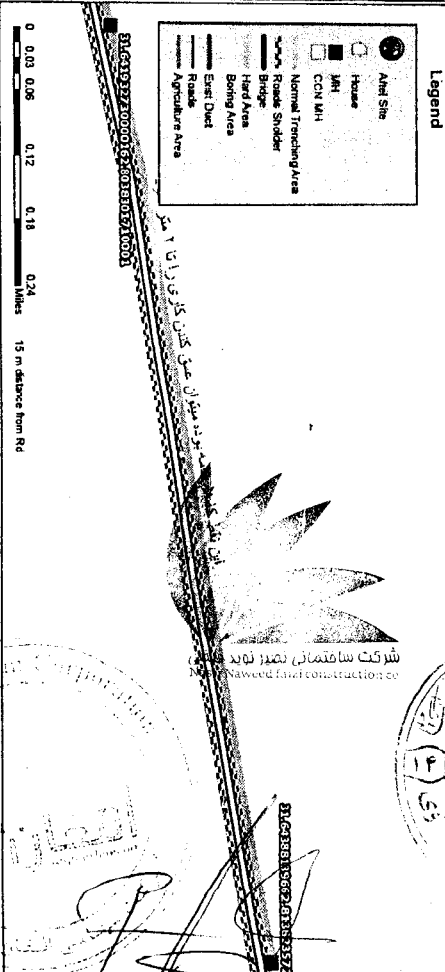


البحان

Delamram Dorahi to Gharghuri District OFC Map

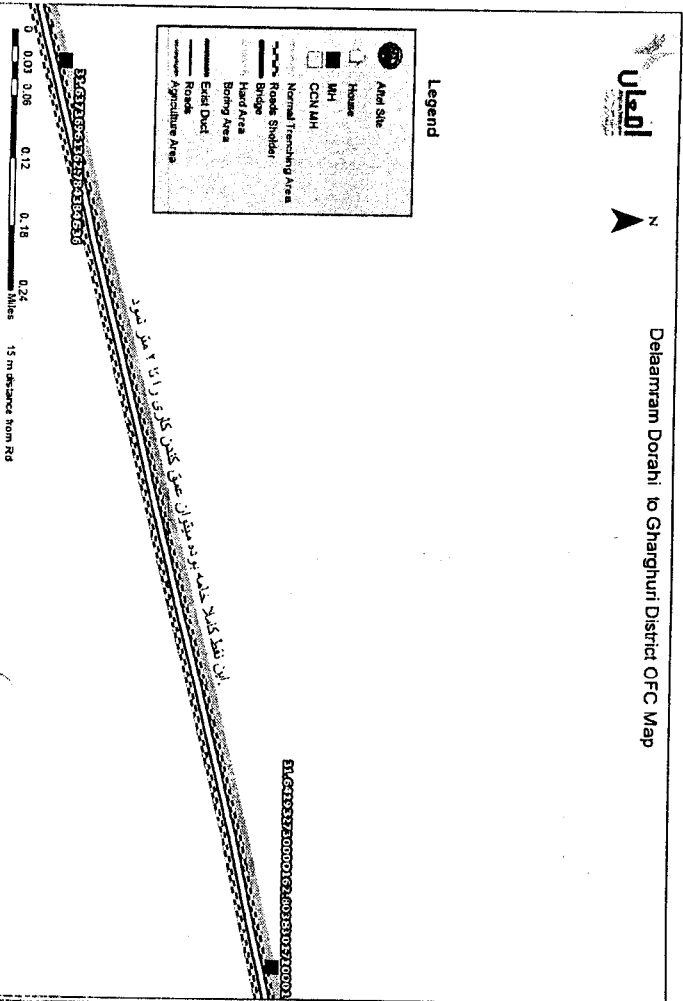

البحان


Delamram Dorahi to Gharghuri District OFC Map

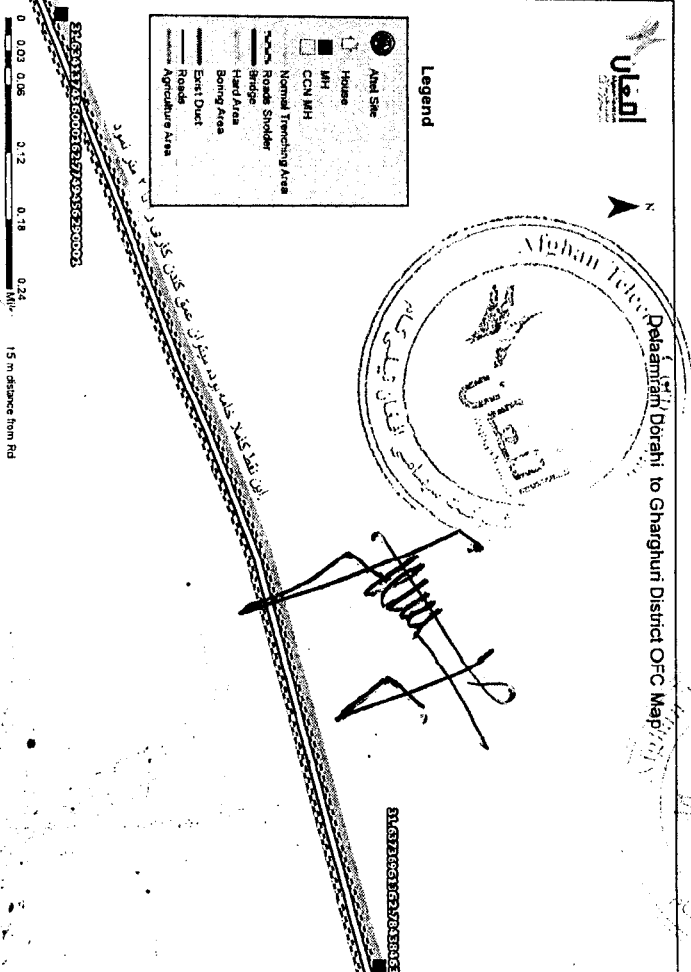

البحان


Delamnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

81.6081038500016372834955

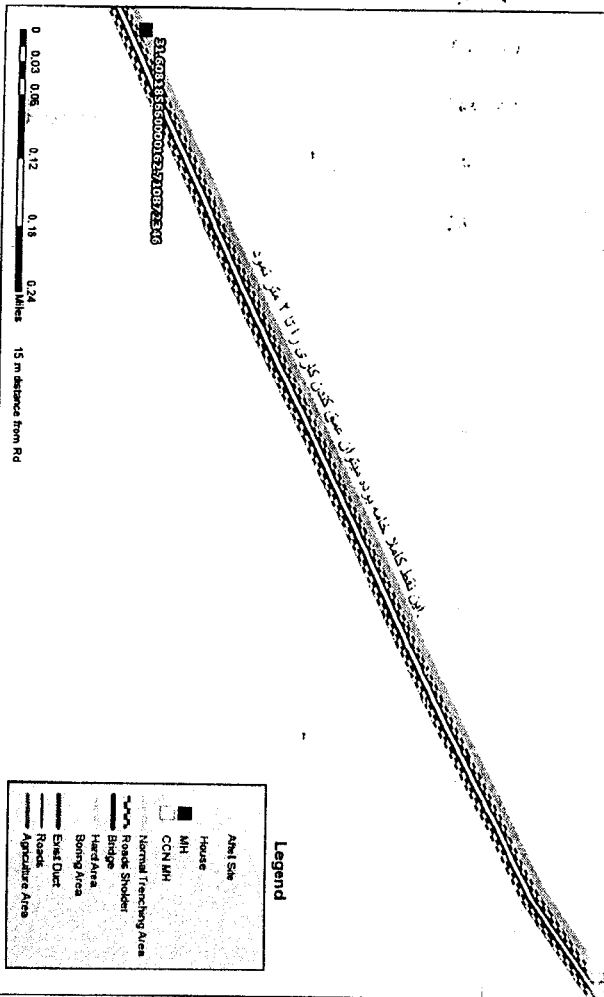

البحان


Delamnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

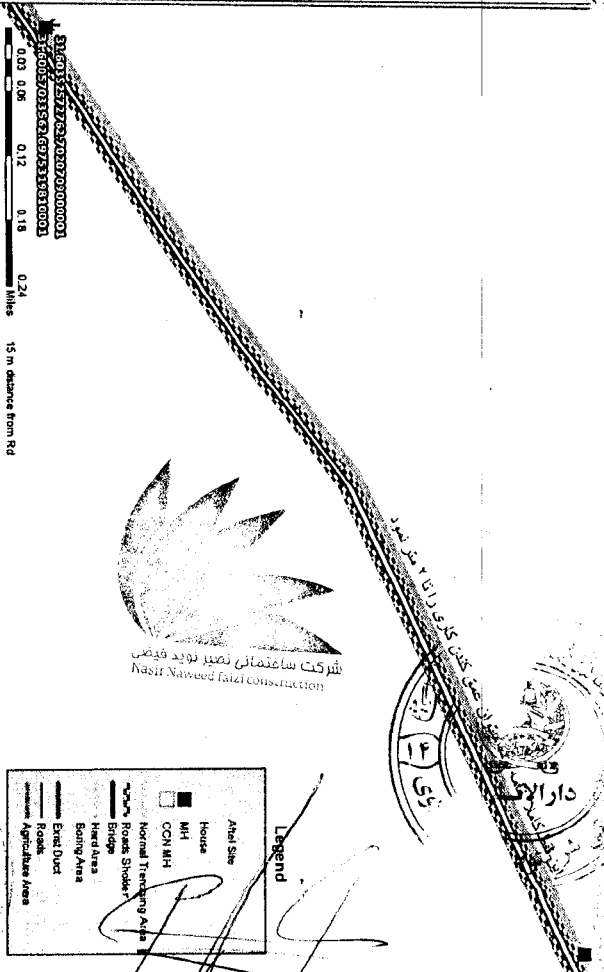

البحان

Delamnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map


81.6085203383692333010001

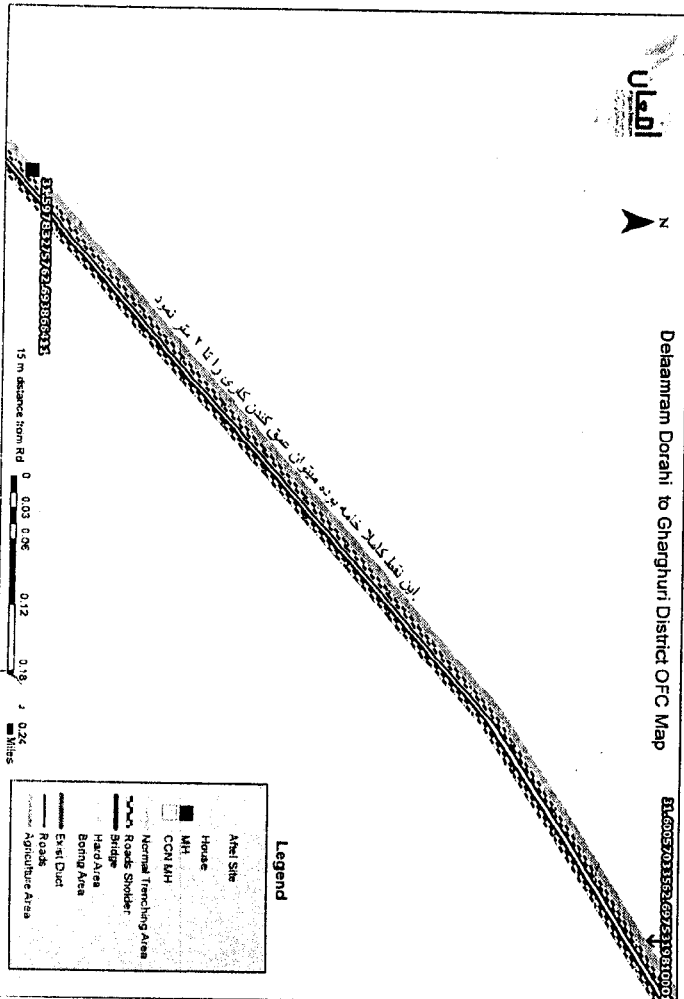

البحان

Delamnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

81.60913337916369903333

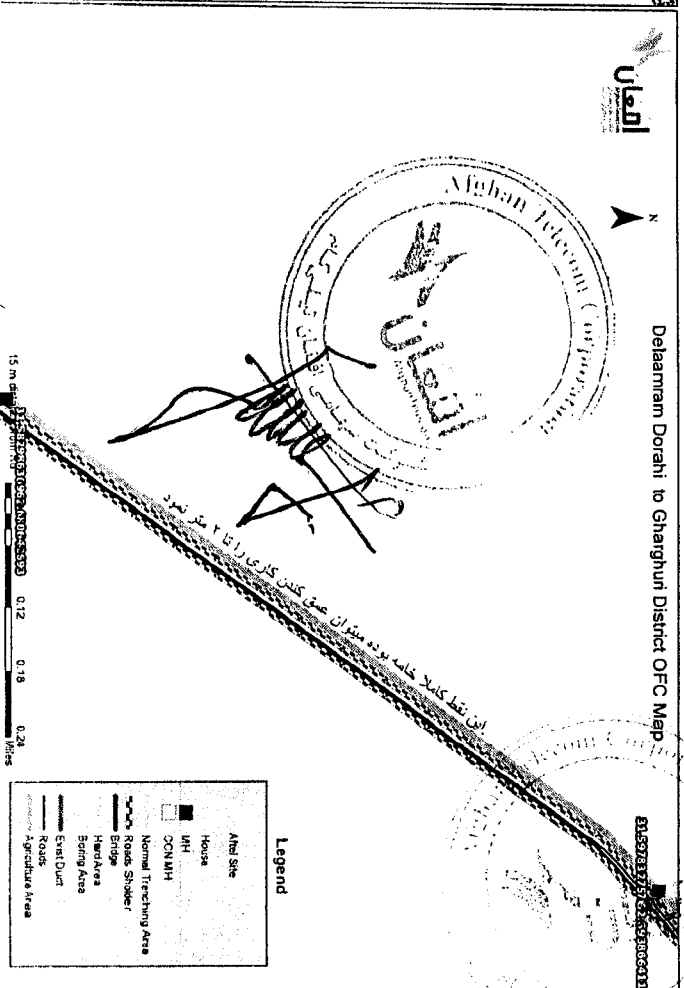


افغان



Dehnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

ES:5300531000162-6699753-0003

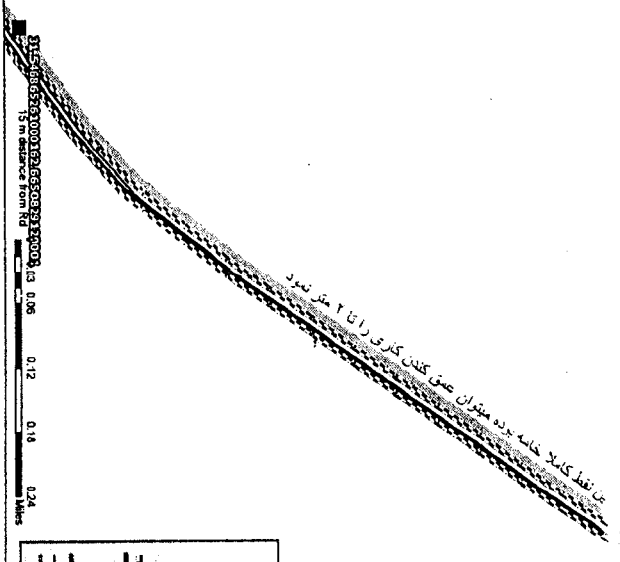

Legend


Abul Site	House
MH	CCN MH
Normal Trenching Area	Roads Shoulder
Hard Area	Boring Area
Box Duct	Roads
Agriculture Area	

افغان



Dehnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

ES:5300531000162-6699753-0003

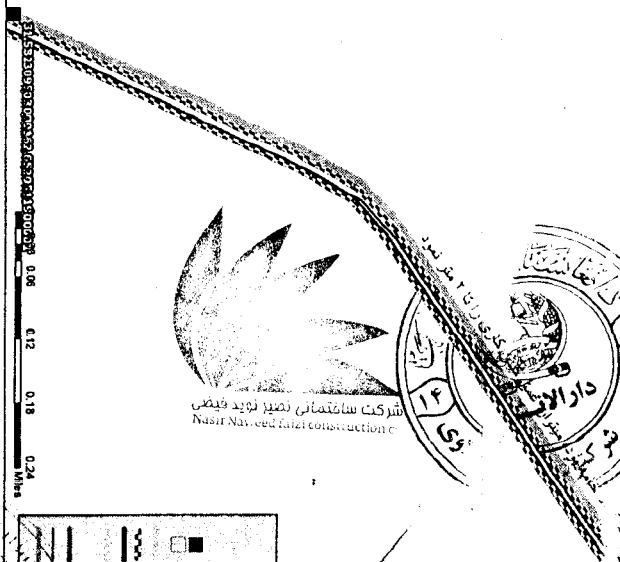

Legend


Abul Site	House
MH	CCN MH
Normal Trenching Area	Roads Shoulder
Hard Area	Boring Area
Box Duct	Roads
Agriculture Area	

افغان



Dehnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

ES:5300531000162-6699753-0003

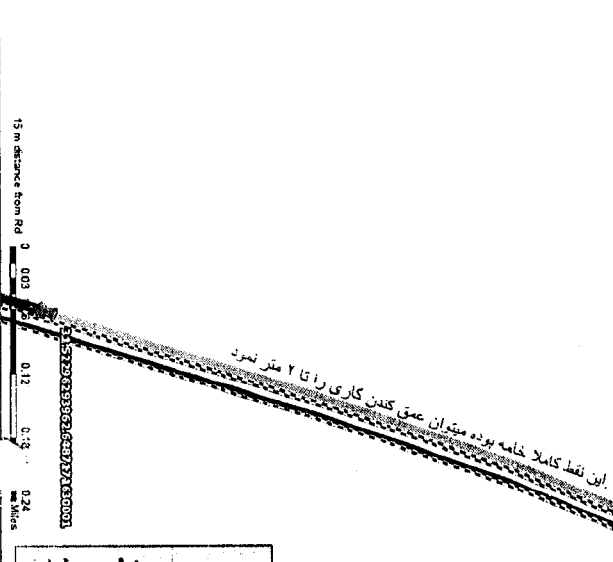

Legend


Abul Site	House
MH	CCN MH
Normal Trenching Area	Roads Shoulder
Hard Area	Boring Area
Box Duct	Roads
Agriculture Area	

افغان



Dehnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

ES:5300531000162-6699753-0003

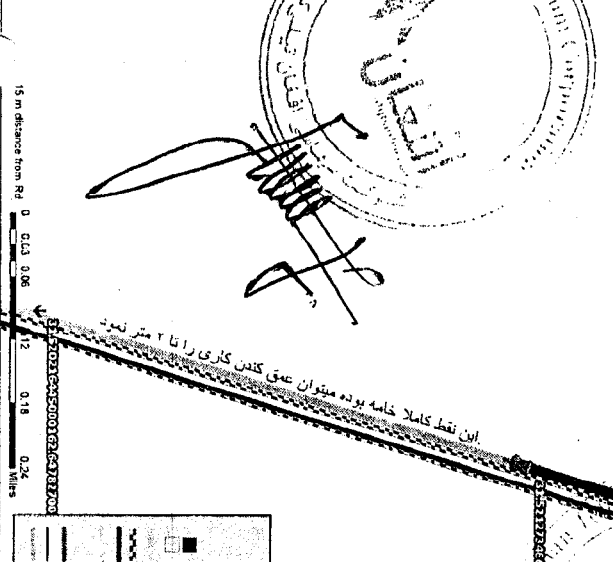

Legend

Abul Site	House
MH	CCN MH
Normal Trenching Area	Roads Shoulder
Hard Area	Boring Area
Box Duct	Roads
Agriculture Area	

المان

Dehnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

این نقطه کاملاً خامه بوده میتوان عمق کندن کاری را تا ۲ متر نمود

0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles

Legend

- Abul Site
- House
- MH
- CCN MH
- Normal Trenching Area
- Roads Shoulder
- Bridge
- Hard Area
- Boring Area
- Exit Duct
- Roads
- Agriculture Area

المان

Dehnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

شرکت ساختمانی تعمیر و نوود قیضی
Nasri Naweed tairi construction co

15 m distance from Rd 0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles

Legend

- Abul Site
- House
- MH
- CCN MH
- Normal Trenching Area
- Roads Shoulder
- Bridge
- Hard Area
- Boring Area
- Exit Duct
- Roads
- Agriculture Area

المان

Dehnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

این نقطه کاملاً خامه بوده میتوان عمق کندن کاری را تا ۲ متر نمود

0 0.03 0.06 0.12 0.18 Miles

Legend

- Abul Site
- House
- MH
- CCN MH
- Normal Trenching Area
- Roads Shoulder
- Bridge
- Hard Area
- Boring Area
- Exit Duct
- Roads
- Agriculture Area

المان





Dehnam Dorahi to Gharghuri District OFC Map

این نقطه کاملاً خامه بوده میتوان عمق کندن کاری را تا ۲ متر نمود

15 m distance from Rd 0 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 Miles


Legend

- Abul Site
- House
- MH
- CCN MH
- Normal Trenching Area
- Roads Shoulder
- Bridge
- Hard Area
- Boring Area
- Exit Duct
- Roads
- Agriculture Area

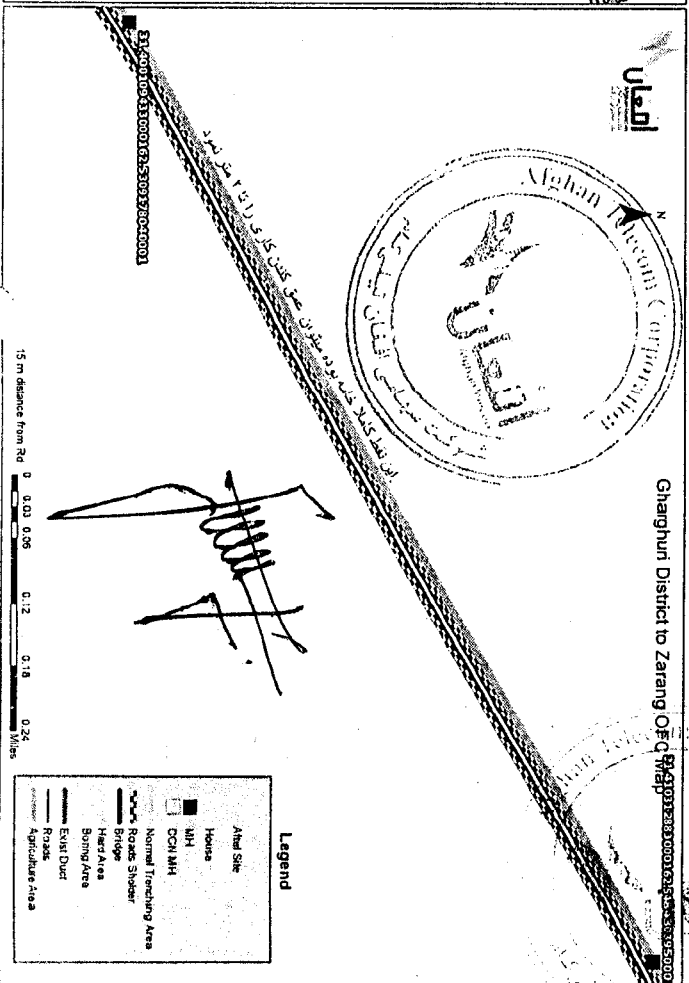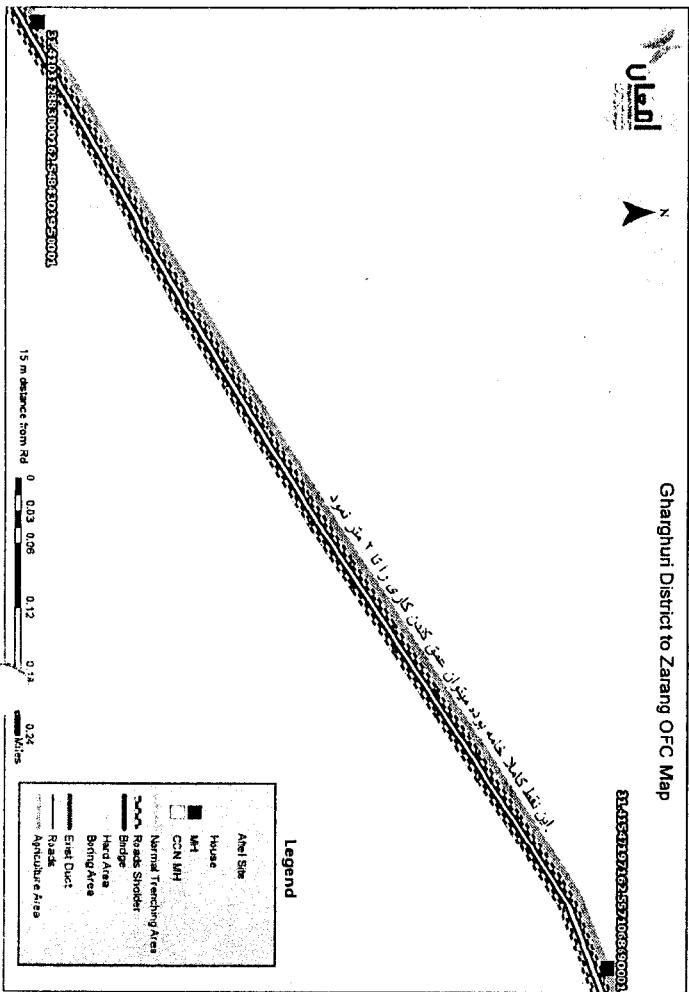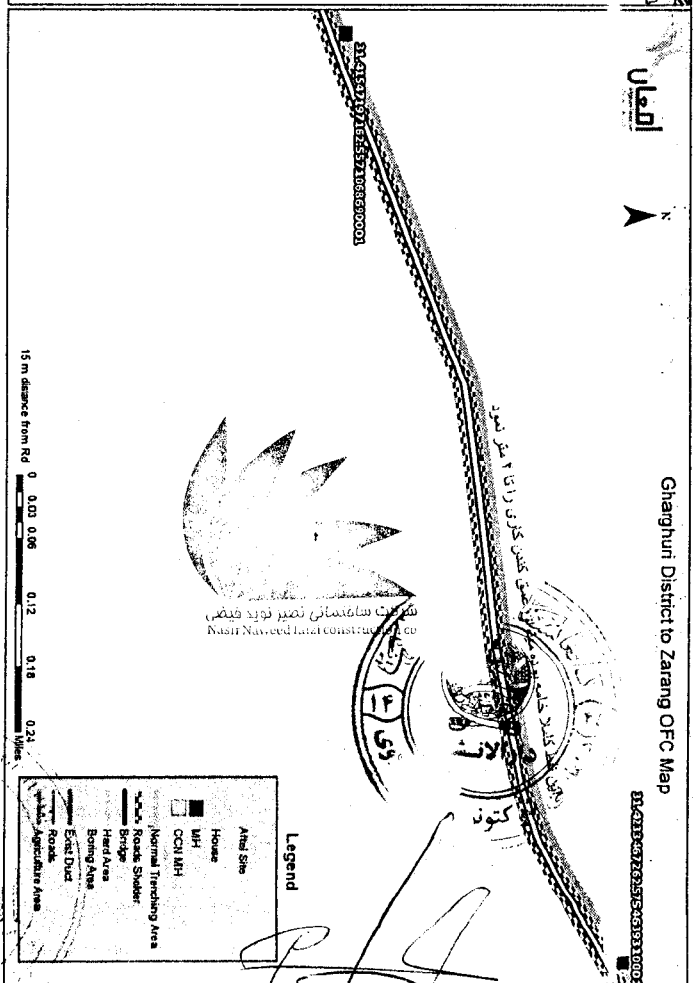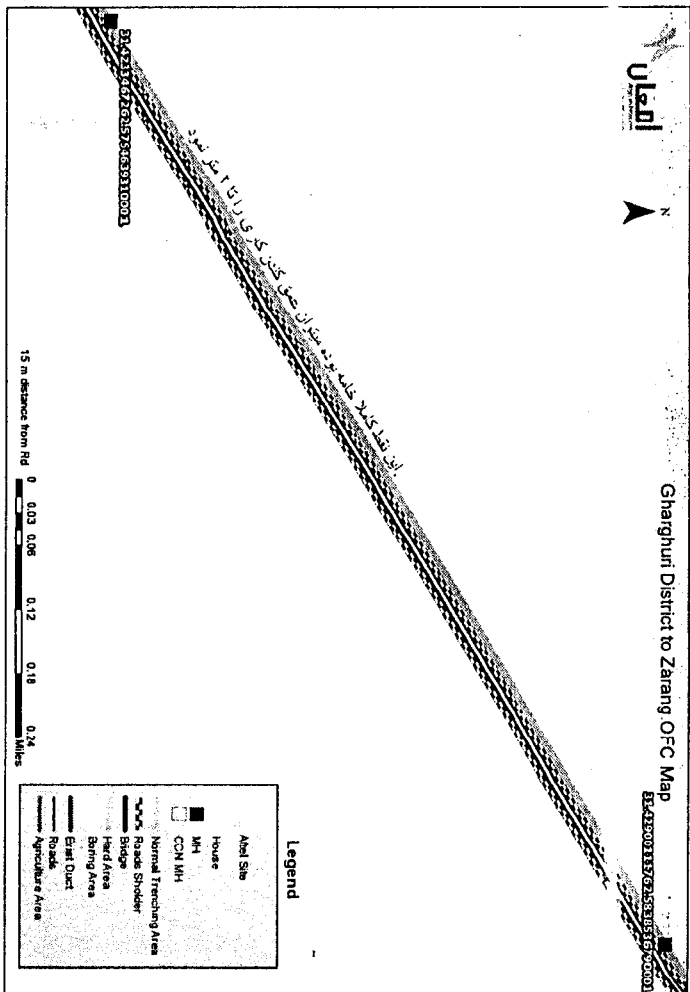


البحان

Gharhuni District to Zarang O/C Map

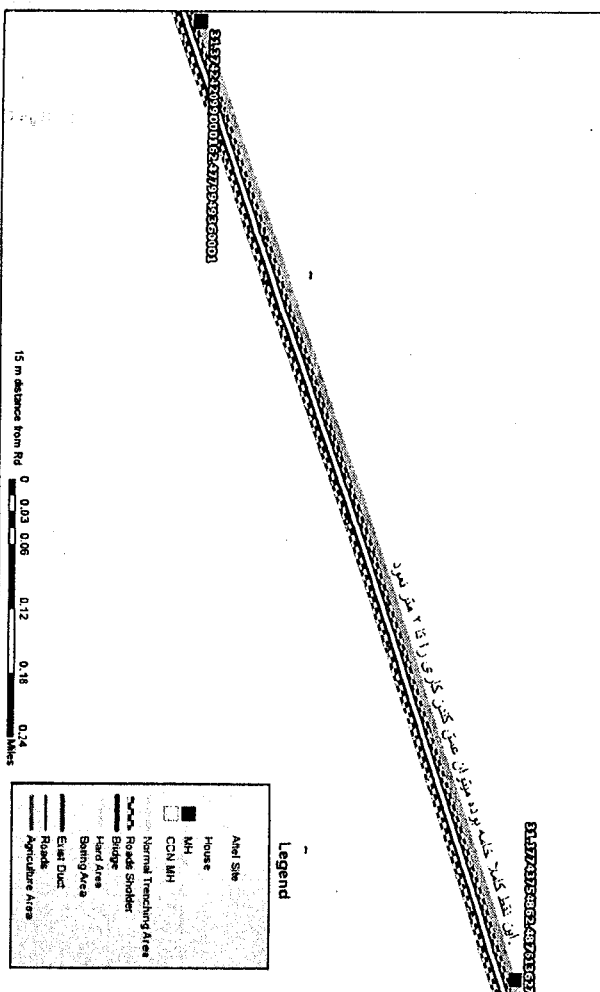


البحان

Gharhuni District to Zarang O/C Map

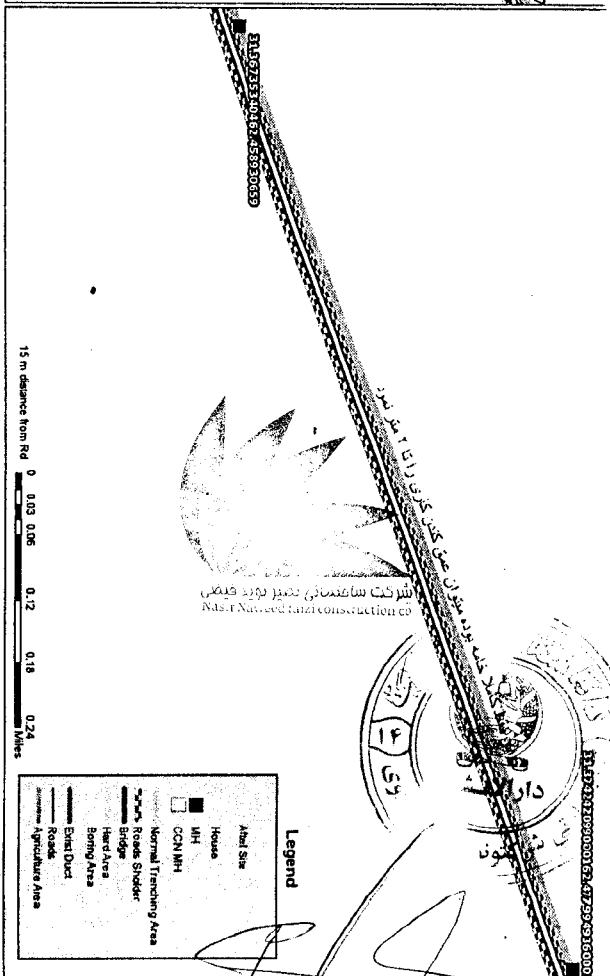


البحان

Gharhuni District to Zarang O/C Map

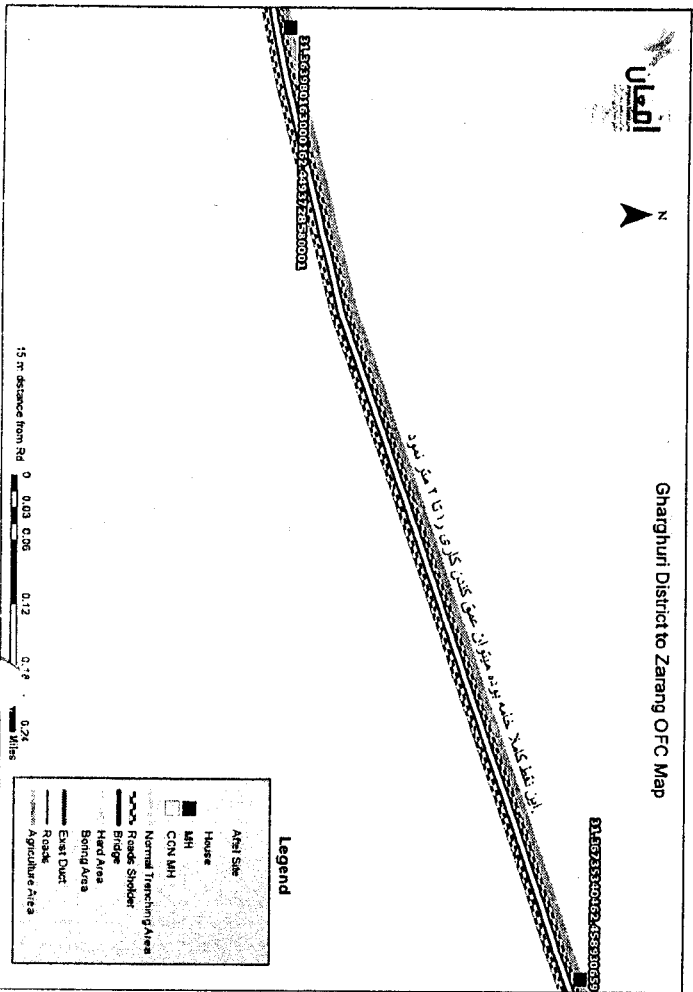

البحان

Gharhuni District to Zarang O/C Map

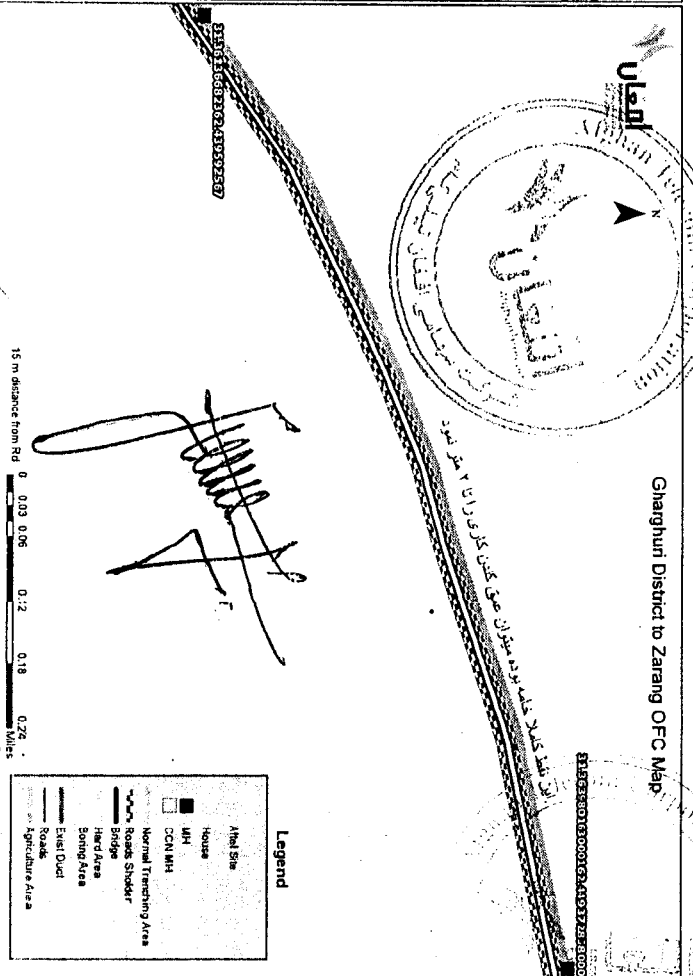

16- قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.

17- تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.

18- مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.

19- تأسیسات: منضعات امور ساختمانی که دارائی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد.

20- مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسئولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.

21- SCC: به معنی شرایط خاص قرارداد است.

22- ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.

23- گزارش بررسی ساحه: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

24- مشخصات: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات وارده یا تائید شده توسط مدیر پروژه می باشد.


25- تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد.

26- قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.

27- ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.

28- تعدیل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.

29- امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفريات، نصب، مونتاز، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.




2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکر یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می نماید.	ماده 2- تفسیر
2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.	
2.3 اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردند: 1- موافقتنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات تخیکی؛ 7- نقشه ها؛ 8- بل احجام کاری؛ و 9- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.	
3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.	ماده 3- زبان و قانون قرارداد
4.1 مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.	ماده 4- تصمیم مدیر پروژه
5.1 مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.	ماده 5- واگذاری
6.1 هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد.	ماده 6- ارتباطات
7.1 قراردادی باید اداره را کتباً در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبلاً در آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسؤولیت های اكمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.	ماده 7- عقد قراردادی های فرعی



[Handwritten signature]




7.2 در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.	
8.1 قراردادی ساحه کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.	ماده 8- سایر قراردادی ها
9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تأیید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.	ماده 9- کارمندان
9.2 مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.	
10.2 اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.	ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی
11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد: 1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از: (1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا پذیر امور ساختمان باشد؛ یا (2) غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی 2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.	ماده 11- خطرات مربوط اداره
11.2 خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار	





[Handwritten signature]




الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد: 1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛ 2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا 3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.	
12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤولیت قراردادی می باشد.	ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی
13.1 قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد: 1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛ 2- زیان یا خساره تجهیزات؛ 3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و 4- صدمه شخصی یا مرگ.	ماده 13- بیمه
13.2 قراردادی، پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.	
13.3 در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.	
13.4 هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.	
13.5 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.	
14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.	ماده 14- گزارش تحقیق ساحه
15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.	ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد
16.1 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.	ماده 16- قراردادی




ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان	17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.
ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروژه	18.1 قراردادی مشخصات تخنیکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تأیید ارائه می نماید. 18.2 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد. 18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسئولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های موقت را متاثر نمی سازد. 18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید. 18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دایمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروژه تأیید گردند.
ماده 19- ایمنی	19.1 قراردادی مسئول ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.
ماده 20- اکتشاف	20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.
ماده 21- ملکیت ساحه	21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.
ماده 22- دسترسی به ساحه	22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد.
ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی	23.1 قراردادی تمام دساتیر مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد. 23.2 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.
ماده 24- منازعه	24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد. 24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.
ب. کنترل زمان	
ماده 25- پلان کاری	25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانی را جهت تأییدی به مدیر پروژه ارائه نماید.




25.2 پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلسل فعالیت ها باشد.	
25.3 قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.	
25.4 تأیید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و وقایع قابل جبران می باشد.	
26.1 مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.	ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل
26.2 مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات وقایع قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایتی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.	
27.1 در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و توسط اداره و قراردادی تأیید میگردد.	ماده 27- تسریع
27.2 پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.	
28.1 مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.	ماده 28- تأخیر سفارش شده توسط مدیر پروژه
29.1 اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند 1 ماده 32 می باشد.	ماده 29- جلسات مدیریت
29.2 مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کاپی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.	
30.1 قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد	ماده 30- هشدار زود هنگام



و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.	
30.1 قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیلنخل در جهت انجام امور مدیر پروژه، همکاری می نماید.	
ج. کنترل کیفیت	
31.1 مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسئولیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است، بررسی می نماید.	ماده 31- تشخیص نواقص
32.1 در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.	ماده 32- آزمایش
33.1 مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هر گونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.	ماده 33- تصحیح نواقص
33.2 قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسط مدیر پروژه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می نماید.	
34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامينات قراردادی وضع می گردد.	ماده 34- نواقص تصحیح نشده
د. کنترل مصارف	
35.1 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.	ماده 35- بل احجام کاری ¹
35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگردد.	

¹ در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد با بند 2 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد به شکل ذیل تعویض گردد:
بند 1 ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را در جریان 14 روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.
بند 2 ماده 37 در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.

² در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده 38 شرایط عمومی قرارداد با بند 1 ماده 38 شرایط عمومی قرارداد به شکل ذیل تعویض گردد:
بند 1 ماده 38 تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگردد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.



ماده 36- تغییر مقدار ²	36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.
ماده 37- اضافه کاری و کم کاری	37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.
ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها	38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید. 38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبلاً ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید. 38.4 در صورتیکه به نسبت استجعالیت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می شود. 38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.
ماده 39- تخمین جریان پول نقد	39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری ³ ، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.
ماده 40- تصدیق نامه پرداخت ها	40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید. 40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید. 40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد. 40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری ⁴ تکمیل شده می باشد. 40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد. 40.6 مدیر پروژه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.
ماده 41- پرداخت ها	41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد. 41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.

³ در قرارداد با پرداخت بالامقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد؛
⁴ در قرارداد با پرداخت بالامقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شدم در برگزیده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول فعالیت می باشد"

